

<p align="center">FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)</p>			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 1 de 67

1. DATOS GENERALES:

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FUNCIONARIO(S) RESPONSABLES DE LA ENTREGA	Ing MARIO E SUANCA PULIDO Ing. HUGO ESPINOSA SEPULVEDA
CARGO(S)	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DIRECTOR TECNICO
NOMBRE FUNCIONARIO QUE APOYA EL PROCESO	Ing JOSE MAURICIO RODRIGUEZ
CARGO FUNCIONARIO QUE APOYA EL PROCESO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TEMA DE ENTREGA	Acta de entrega empalme secretaría de infraestructura
FECHA DE SESIÓN	4 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA	4 de diciembre de 2023
NOMBRE(S) DELEGADO(S) DEL MANDATARIO ELECTO QUE RECIBE	Ing RAFAEL ANTONIO RIVERA GOMEZ VANEZA FORERO AREVALO
NOMBRE DEL DELEGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	SANDRA MILENA RUIZ MONCADA

Con la presente Acta Parcial de Informe de Gestión, describo los principales aspectos de la acción adelantada como secretaría de Infraestructura, en el periodo comprendido entre el primero (01) de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 2 de 67
--------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------

2. INFORME EJECUCIÓN METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PLAN DE DESARROLLO "TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

A continuación, se presenta el estado de ejecución de las metas del Plan de Desarrollo Municipal, conforme al Acuerdo No. 004 del 31 de mayo de 2020, "Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Tocancipá Trabajamos Para Ti 2020-2023" por meta de producto, para cada una de las vigencias y del cuatrienio.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL

PRODUCTO: VIA TERCIARIA CONSTRUIDA

CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: vía terciaria construida

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	2	2	100%
2021	2	2	100%
2022	0.50	0.25	50%
2023	0.50	0.20	40%

META CUATRIENIO: 5 Kms

AVANCE CUATRIENIO: 15.9 Kms.....100%

ID SECTOR	LONG M/L
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ - COLOMBIA RURAL PARAMO	600
ASFALTADA CON ASOCENTRO LA REJILLA COSTADO IZQUIERDO	140
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN VIA EL MANANTIAL	1400
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA VIA QUINDIGUA VEREDA CANAVITA	1720
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA VIA LA SELVA	670
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SECTOR LOS TINJACA VEREDA LA ESMERALDA	400
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	652
PAVIMENTACIÓN DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	2270
CONSTRUCCIÓN EMPATES VIALES SOBRE BTS	4600
CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS VIAS RURALES VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	3250
CALLE 12 FRENTE AL HOSPITAL	278
TOTAL	15980

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)


CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 3 de 67

Registro fotográfico (Sector La Fuente)

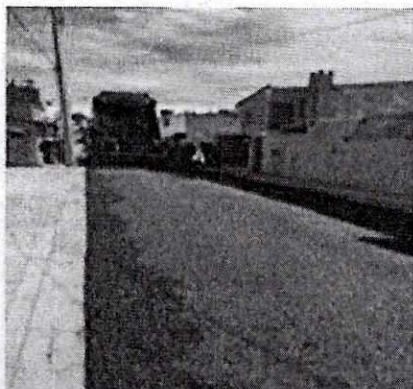

Tramo 5




Tramo 10-3



Tramo Quindigua 0-0



Tramo Quindigua 0

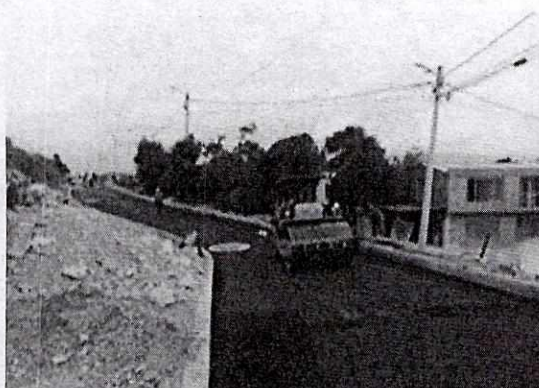

Tramo Piedemonte



Tramo Quindigua ANI

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)




CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 4 de 67

Registro fotográfico (Placa huella – sector “La Rejilla”)

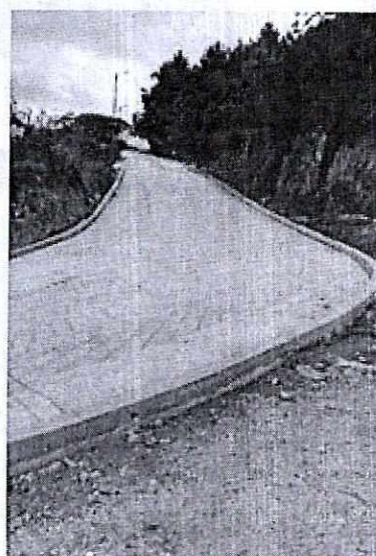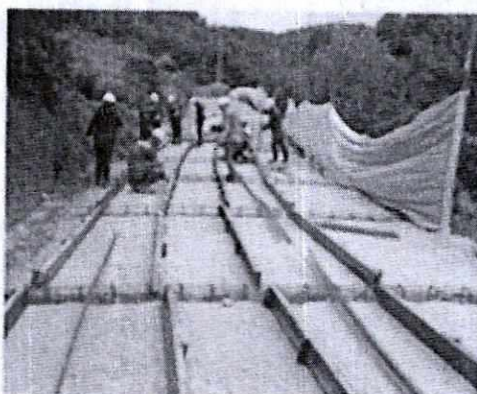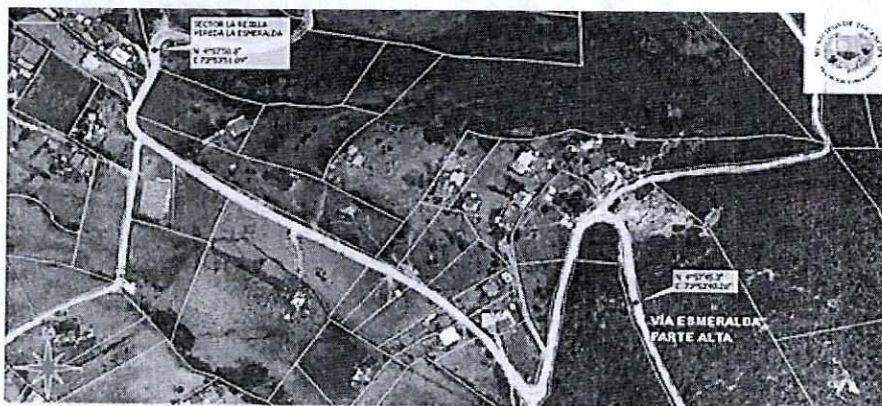

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)



CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 5 de 67

Registro fotográfico (sector “El Manantial”)

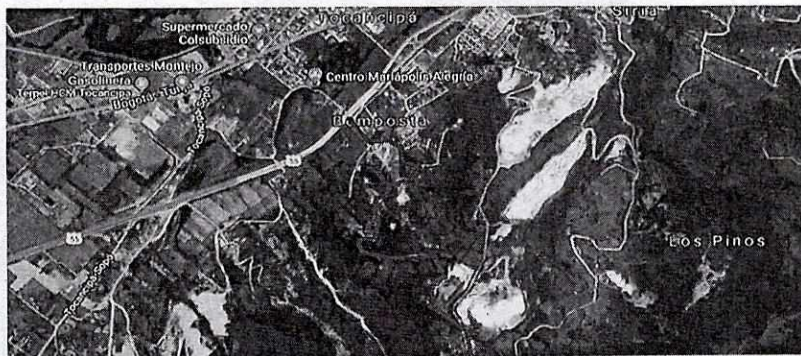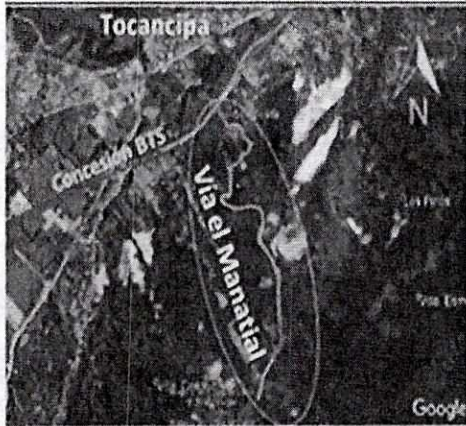

adicionalmente a los trabajos anteriormente mencionados, se suscribieron los contratos contrato de obra número CT: 518 MT 2023 y de interventoría número CT: 544 MT – 2023, cuyo objeto es la “construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas y rurales y construcción de puente peatonal en el municipio de Tocancipá” mediante los cuales se intervendrán los siguientes sectores:

ID SECTOR	LONG M/L
VIA MANANTIAL	400
VIA LA SELVA	110
VIA LOS CEREZOS	158
VIA SECTOR LOS GOMEZ	137
VIA LA VIRGEN	130
VIA SECTOR PATIÑO	130
VIA SECTOR ARIZMENDI	120
ANDENES Y OTROS	600

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 10 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 6 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL

PRODUCTO: VIA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO

CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: vía terciaria con mantenimiento rutinario

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	40	40	100%
2021	40	40	100%
2022	40	40	100%
2023	40	27	0.68%

META CUATRIENIO: 160 Kms

AVANCE CUATRIENIO: 147 Kms.....92%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se ejecutó el mantenimiento rutinario de los 40 kms anuales, permitiendo un ciclo de intervención de dos veces por año en cada uno de los diferentes sectores que se indican a continuación, presentando un avance de cumplimiento del 100%

ID SECTOR	
LA FUENTE	SECTOR CHICALÁ
ESCUELA ALTO MANATIAL - BUENOS AIRES	ENTRADA URB LAS PALMAS
BAJO MANANTIAL	SECTOR PATIÑO
EL PORVENIR	SECTOR GOMEZ
DEL MANANTIAL A CASA DE SUEÑOS	SECTOR PORVENIR (detrás de la cancha de golf)
LA REJILLA - PISTA BICI CROSS	SECTOR LA CUCHILLA
LA REJILLA - PEÑAS BLANCAS	SECTOR JUANCHO POLA
PEÑAS BLANCAS - PIONONO	ANILLO VIAL DE CANAVITA
SALON COMUNAL BUENOS AIRES - PIONONO	SECTOR LAS MERCEDES
SECTOR PORRAS ACEVEDO	SECTOR PUENTE LOS PROFESORES
SECTOR LOS MANZANOS	SECTOR COLPAPEL
SECTOR CHICO NORTE	VIA TRES ESQUINAS A CASA BLANCA
SECTOR LA DIANA	SECTOR FINCA EL PINCEL - BASE ECOPETROL
SECTOR EBEL	SECTOR EL PINCEL - CABALLERO DE LA VIRGEN
PIEDEMONTES ESCUELA CANAVITA	SECTOR EL TABLON
SECTOR OJO DE AGUA	SECTOR HOTEL THEMIS
PASOS A NIVEL Y PARALELAS LINEA FERREA	SECTOR ARISMENDI
SECTOR ANTENAS	MANATIAL SECTORES (PARTA ALTA Y PARTE BAJA)

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054


VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 7 de 67

Adicional a los sectores anteriormente mencionados, se intervino la vía sector Briceño a Tibitóc mediante convenio suscrito con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).

REGISTRO FOTOGRAFICO

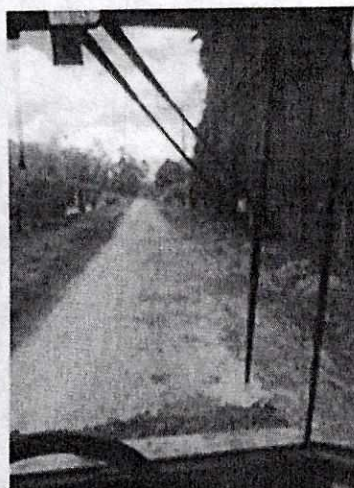

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 61 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 8 de 67
--------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL

PRODUCTO: VIA URBANA CON MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO

CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: vía urbana con mantenimiento rutinario


VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	0.50	NO REPORTADO	0%
2021	4.50	4.50	100%
2022	2.50	2.50	100%
2023	2.50	0.20	0.08%

META CUATRIENIO: 10 Kms

AVANCE CUATRIENIO: 7.2 Kms.....72%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se adelantaron actividades propias de reparcheo y repavimentación en diversos sectores tales como: carrera 7, calle 16, vía la fuente, anillo vial entre otros, adicionalmente a los trabajos adelantados con personal adscrito a esta secretaria, se ejecutó el mantenimiento de la carrera 7 entre el coliseo y sector la trampa dentro del convenio celebrado con ASOCENTRO consistente en la reposición de la carpeta asfáltica, para una longitud total de intervención de 7.20 Kms a la fecha.

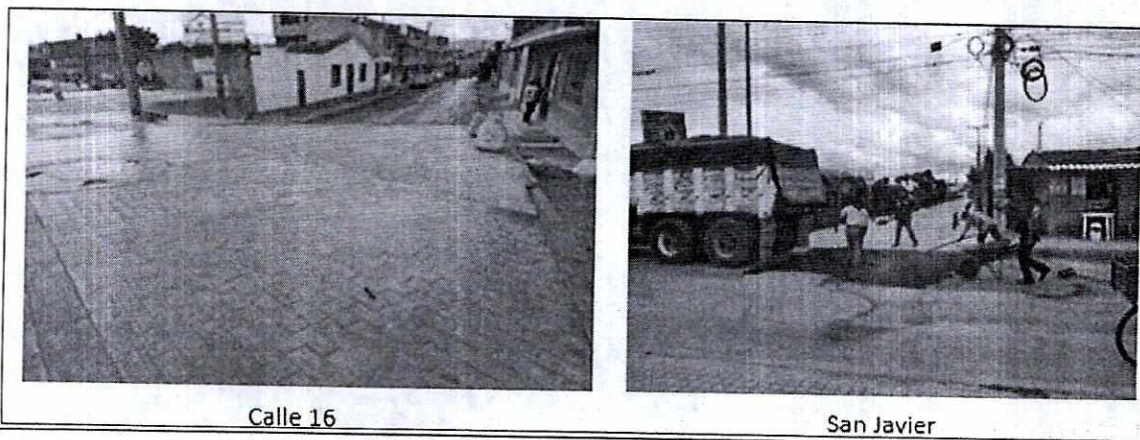

Las anteriores actividades se complementarán mediante una intervención de obra, con un aporte financiero adicional durante el presente mes de diciembre dentro del convenio con ASOCENTRO en los siguientes sectores:

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 9 de 67

- Sector autódromo
- Sector Urbanización San Javier
- Vereda La Fuente
- Entrada Urbanización El Portal

Con la ejecución de dichas obras se garantiza el cumplimiento de la meta de mantenimiento en un 100%

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL

PRODUCTO: PUENTE PEATONAL DE LA RED URBANA CONSTRUIDO

CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: puente peatonal de la red urbana construido

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		N.A
2021	NO PROGRAMADO		N.A
2022	NO PROGRAMADO		N.A
2023	1	0.20	0.20%

META CUATRIENIO: 3 Und

AVANCE CUATRIENIO: 20%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Inicialmente se gestionó ante la ANI y ente la concesión vial ACCENORTE la construcción de los puentes de los sectores La Diana y Dulcinea de los cuales se viabilizo para su construcción el puente peatonal "Dulcinea" razón por la cual se incluyó dentro del proceso de contratación de vías 2023 y se suscribieron los contratos contrato de obra número CT: 518 MT 2023 y de interventoría número CT: 544 MT – 2023, cuyo objeto es la "construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de vías urbanas y rurales y construcción de puente peatonal en el municipio de Tocancipá" los cuales permitirán su ejecución.

En relación con la construcción del puente peatonal sector "La Trampa" cuenta con los diseños técnicos y pendiente de su gestión y aprobación.

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 10 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL

PRODUCTO: PUENTE PEATONAL CON MANTENIMIENTO

CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: puente peatonal con mantenimiento

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		N.A
2021	NO PROGRAMADO		N.A
2022	NO PROGRAMADO		N.A
2023	1	0	NO SE EVALUÁ

META CUATRIENIO: 3 Unid

AVANCE CUATRIENIO: no se evalúa

ACTIVIDADES REALIZADAS

se adelantaron acciones menores de mantenimiento como pintura parcial en los puentes peatonales, teniendo en cuenta que inicialmente se tenía prevista la demolición de estos.

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL

PRODUCTO: CICLO INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN RED VIAL Terciaria

CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: ciclo infraestructura construida en red vial terciaria

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		N.A
2021	NO PROGRAMADO		N.A
2022	NO PROGRAMADO		N.A
2023	10	1.03	0.97%

META CUATRIENIO: 10 Kms

AVANCE CUATRIENIO: 1.03 Kms..... 10.3%

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023




Pág. 11 de 67

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para el cumplimiento de este producto se ejecutaron en total 1030 m/l (560 la fuente, 260 calle 12, 220 Colpapel)



En relacion con la cicloruta hacia la vereda La Fuente se adelantó un prediseño y presupuesto preliminar que deberá ser complementado con los estudios específicos técnicos y ambientales para su viabilidad ante el ICCU.

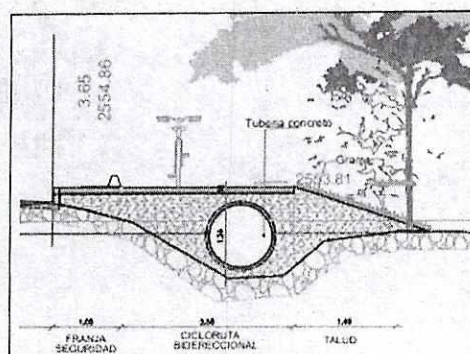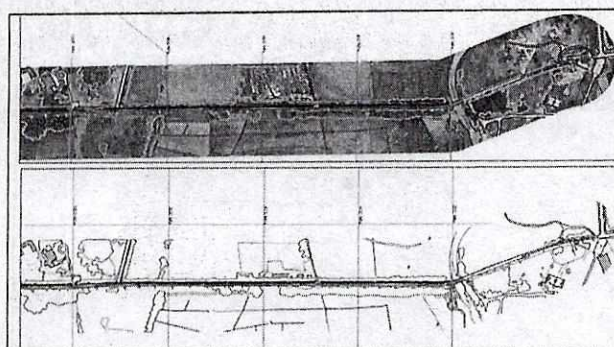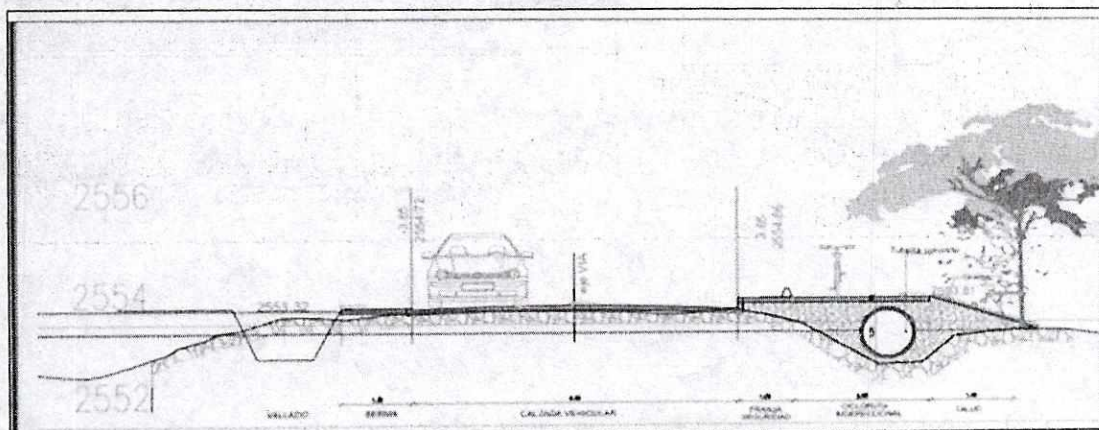

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 12 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL
PRODUCTO: DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS
CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: documentos de lineamientos técnicos realizados (inventario vial consolidado)

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		N.A
2021	NO PROGRAMADO		N.A
2022	NO PROGRAMADO		N.A
2023	1	1	100%


META CUATRIENIO: 1 Unid

AVANCE CUATRIENIO: 1 Unid100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se elaboró el documento denominado "INVENTARIO VIAL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ" en el cual se definió de manera gráfica, estadística y detallada la información correspondiente. Con lo cual se dio un cumplimiento del 100% de la meta

"INVENTARIO VIAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".






FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 13 de 67

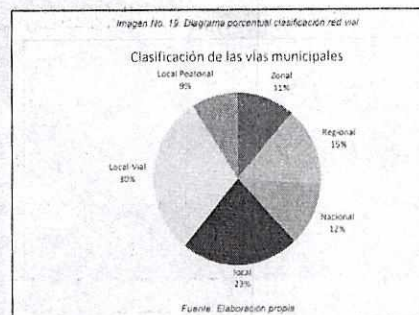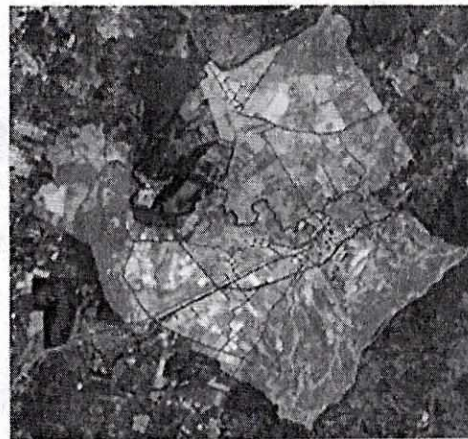

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: NFRAESTRUCTURA RED VIAL Y REGIONAL
PRODUCTO: DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN
CÓDIGO BPIN: 2020258170037

META DE PRODUCTO: documentos de planeación realizados (proyectos de infraestructura vial)

ACTIVIDADES REALIZADAS:

NO PROGRAMADO

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		N.A
2021	NO PROGRAMADO		N.A
2022	NO PROGRAMADO		N.A
2023	NO PROGRAMADO		N.A

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 14 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO

PRODUCTO: ZONAS VERDES ADECUADAS Y MANTENIDAS.

CÓDIGO BPIN: 2020258170029

META DE PRODUCTO: zonas verdes adecuadas y mantenidas



VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		
2021	10	7	70%
2022	5	5	100%
2023	5	8	100%

META CUATRIENIO: 20 zonas

AVANCE CUATRIENIO: 20 zonas.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de esta meta producto con la intervención del personal propio de esta secretaría, se adelantaron los trabajos pertinentes a rocería y poda en las zonas verdes públicas, espacio público y áreas verdes de edificios culturales, educativos e institucionales del municipio las cuales se hacen de manera periódica, para tal efecto se da cumplimiento del convenio 003 de 2022 suscrito con la empresa municipal de servicios públicos S.A ESP.

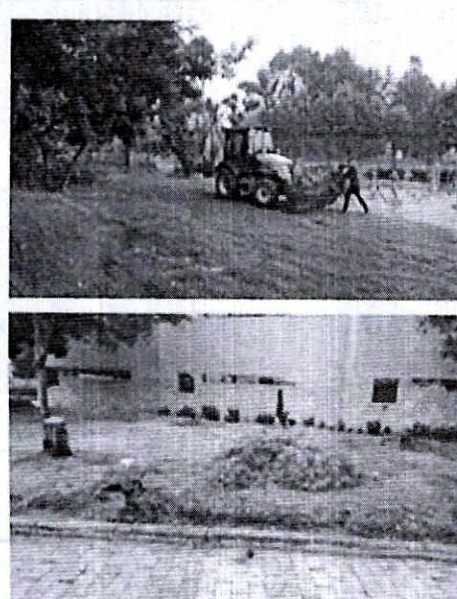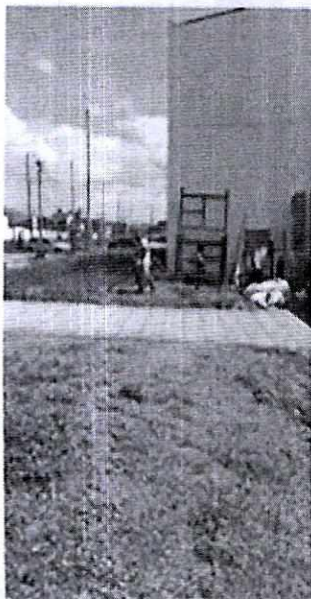

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054
VERSIÓN: 001
FECHA: SEPTIEMBRE 2023
Pág. 15 de 67
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PRODUCTO: SEDES MANTENIDAS (18 SALONES COMUNALES , 17 EDIFICIOS INSTITUCIONALES).
CÓDIGO BPIN: 2020258170033

META DE PRODUCTO: sedes mantenidas (incluye mantenimiento preventivo y correctivo en edificios zonas comunes del municipio)

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	9	9	100%
2021	9	9	100%
2022	9	9	100%
2023	9	8	100%

META CUATRIENIO: 35 sedes

AVANCE CUATRIENIO: 35 sedes.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se ejecutaron las actividades propias del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los edificios públicos con la ejecución de contratos de acuerdo a los recursos previstos para tal fin y con el personal propio de la secretaría se atienden las diferentes sedes que incluyen salones comunales, edificios institucionales y de primera infancia y sus correspondientes zonas comunes, en este año 2023 se hizo el mantenimiento de 8 infraestructuras (san Javier, la diana, dulcinea, chico norte, san Victorino, Antonia santos, aurora y buenos aires)



Mantenimiento acceso
Salón Comunal Dulcinea



Mantenimiento Sede
Principal Alcaldía Municipal



Mantenimiento Sede
Principal Alcaldía Municipal

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 16 de 67



ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PRODUCTO: SEDES CONSTRUIDAS.

CÓDIGO BPIN: 2020258170033

META DE PRODUCTO: sedes construidas (incluye edificios públicos por terminar y sede empresa de servicios públicos, 2 laboratorios)

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2021	1	0.26	0.38%
2022	2	2.00	100%
2023			

META CUATRIENIO: 3 sedes

AVANCE CUATRIENIO: 3 sedes.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento del producto: sedes institucionales construidas, se continuó con la construcción del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ", los salones comunales "TORRES DE SAN JUAN" Y salón comunal "Urb LAS PALMAS" y el "CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS CRIR"

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)






CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 17 de 67

“INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

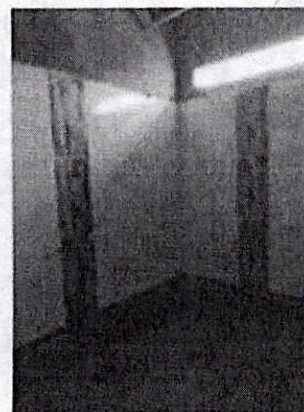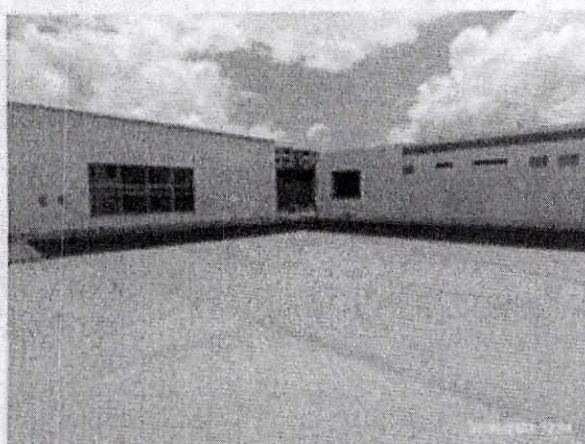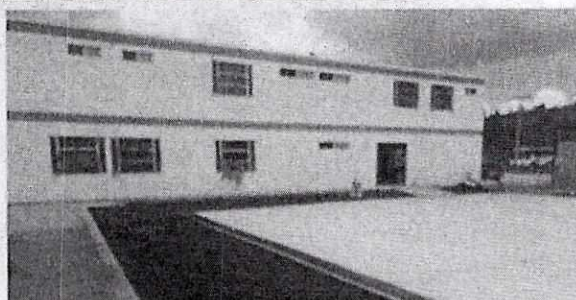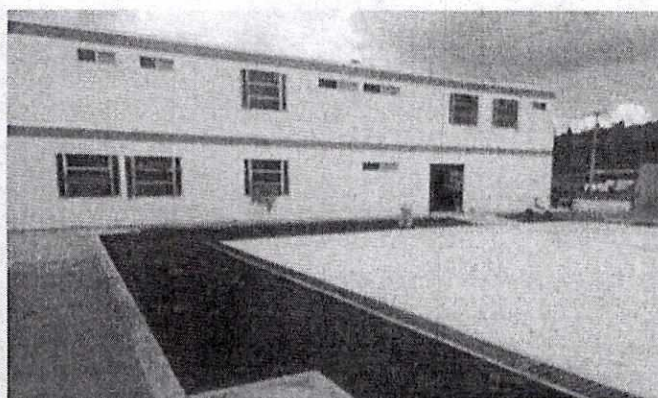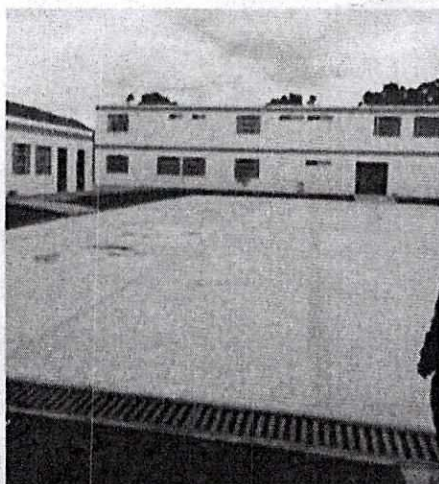

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)




CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001



FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 18 de 67

“SALON COMUNAL URBANIZACIÓN – LAS PALMAS”

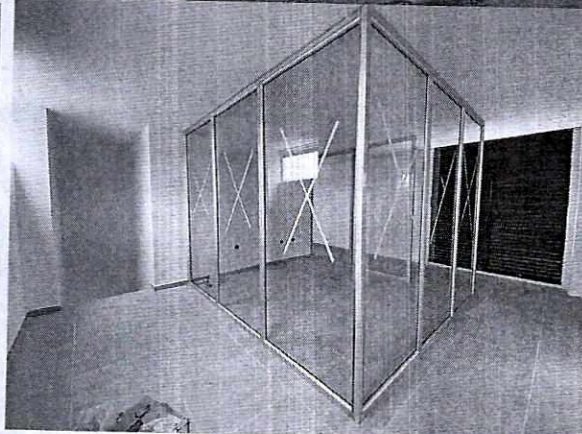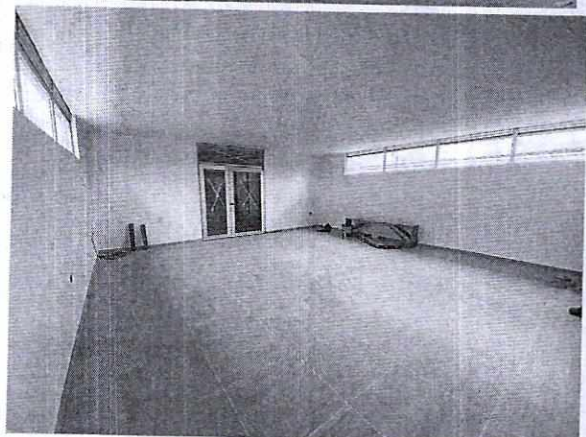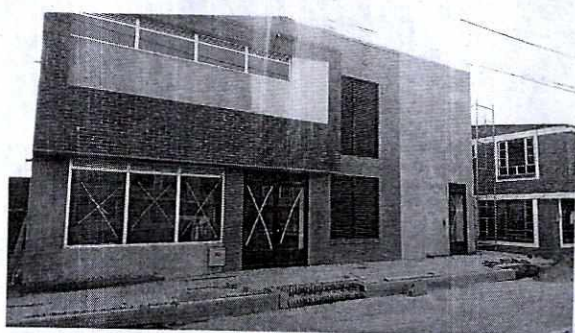



“SALON COMUNAL TORRES DE SAN JUAN”

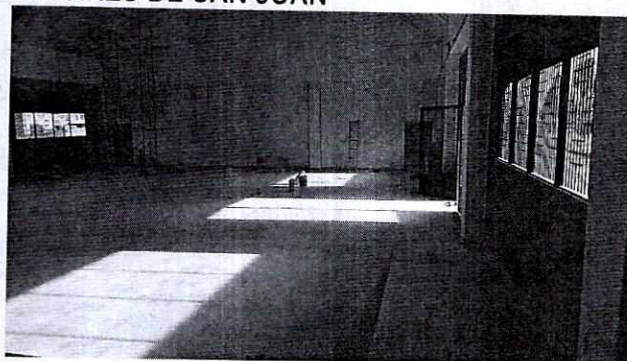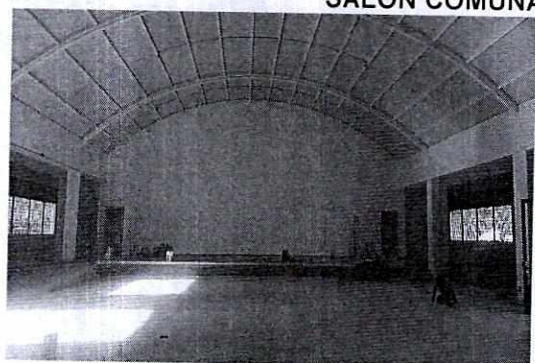

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 04 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054
VERSIÓN: 001
FECHA: SEPTIEMBRE 2023
Pág. 19 de 67

“CENTRO DE ATENCIÓN CRIR CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS CRIR”

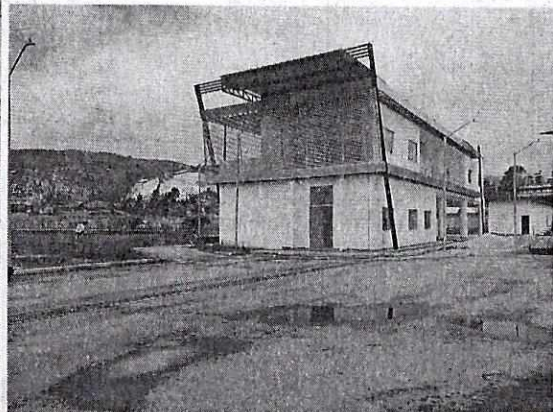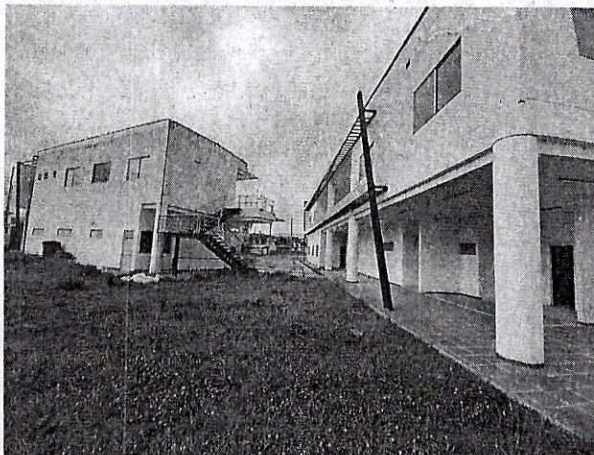

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE)

PRODUCTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

CÓDIGO BPIN: 2020258170030

META DE PRODUCTO: infraestructura deportiva mantenida (12 parques bio saludables, 31 parques infantiles, 21 zonas deportivas)

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	16	16	100%
2021	16	16	100%
2022	16	20	100%
2023	16	16	100%

META CUATRIENIO: 64 escenarios

AVANCE CUATRIENIO: 68 escenarios.....100%

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 20 de 67
--------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

ACTIVIDADES REALIZADAS:


"Se apoyo al instituto de deportes municipal el mantenimiento a las diversas estaciones de parques biosaludables, parques infantiles y zonas deportivas.




Parque Biosaludables Mirador de los Alisos



Parque Infantil la Arboleda

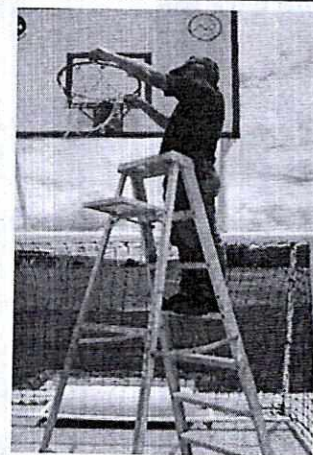

Campos Externos Villa Olímpica

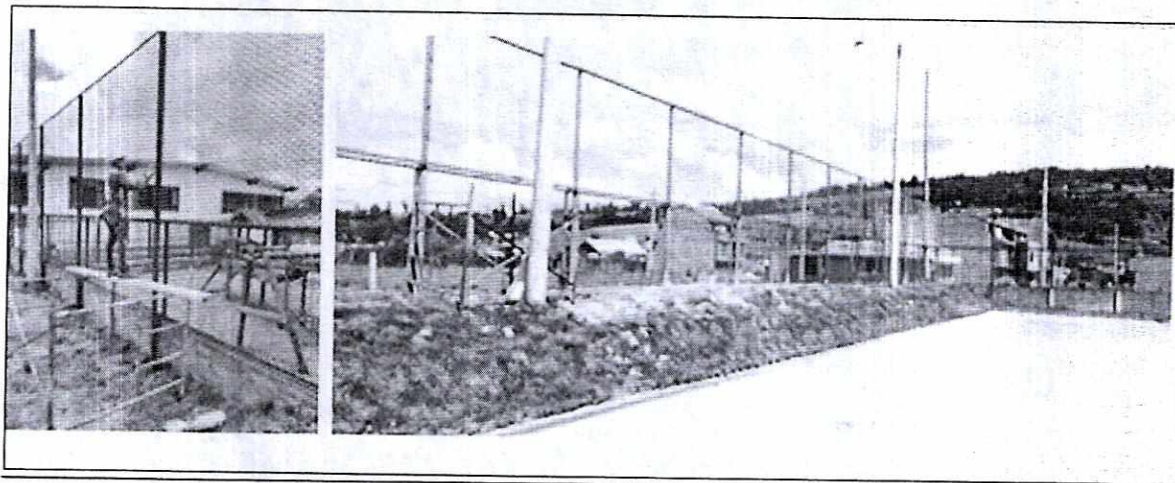

<div>FORMATO ÚNICO</div> <div>ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN</div> <div>TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL</div> <div>TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023</div> <div>(Ley 951 de marzo 31 de 2005)</div>			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 21 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE)
PRODUCTO: PARQUES RECREATIVOS CONSTRUIDOS.
CÓDIGO BPIN: 2020258170030


META DE PRODUCTO: parques construidos

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2021	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2022	1	1	100%
2023	1	1	100%

META CUATRIENIO: 2 parques
AVANCE CUATRIENIO: 2 parques.....100%
ACTIVIDADES REALIZADAS:

se ejecutó la primera etapa del parque Milenium (segunda etapa actualmente en obra) y se continúa con la construcción del parque recreodeportivo "LOS PATOS" en convenio con la entidad ENTERRITORIO.

“PARQUE MILENIUM ETAPAS I y II”

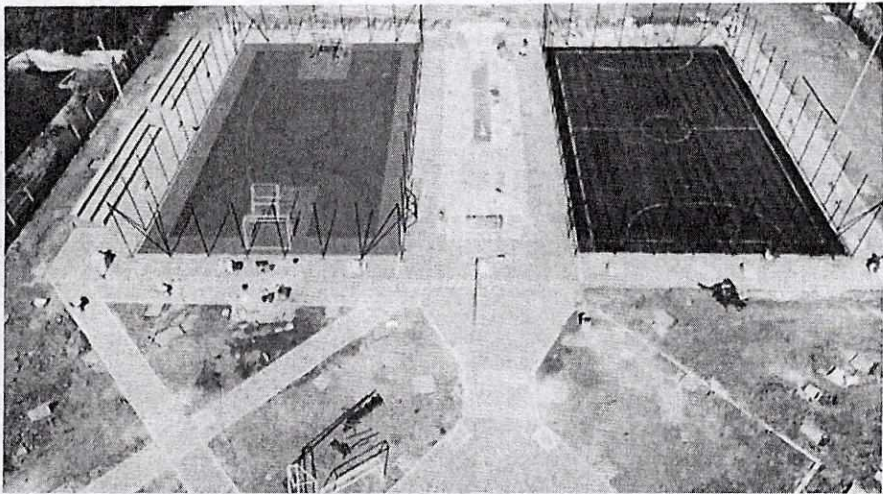

Parque Milenium



FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054


VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023


Pág. 22 de 67

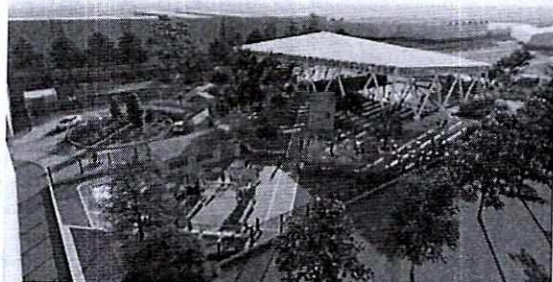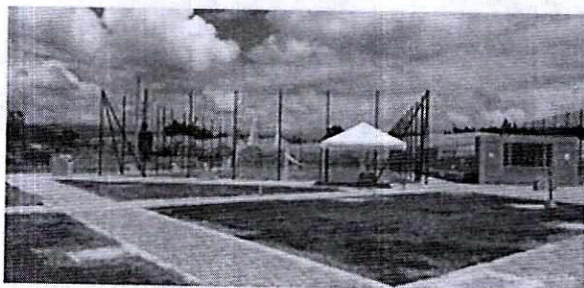

VISTA GENERAL ETAPA I Y II

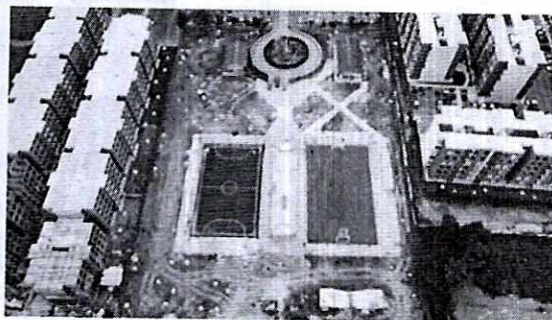

Parque Milenium

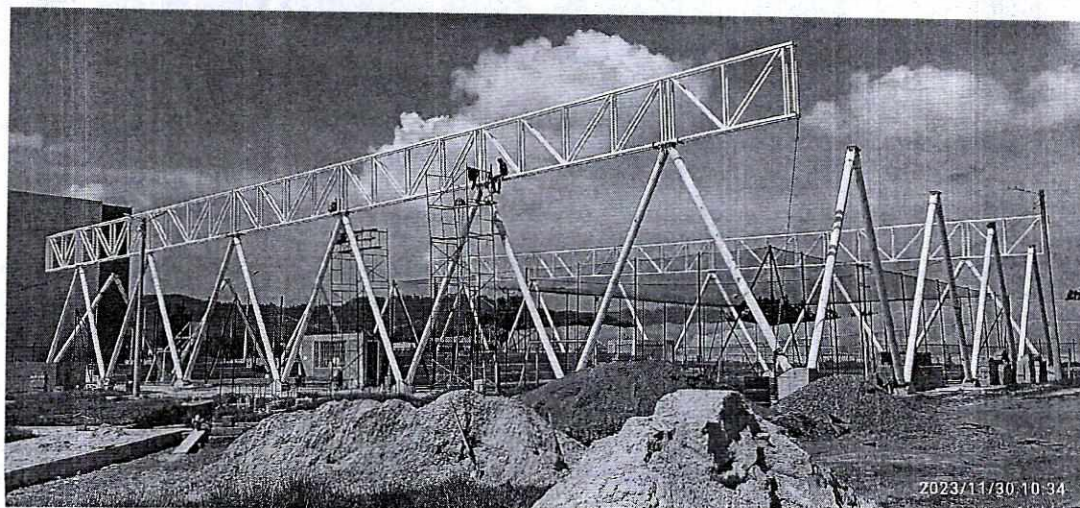

2023/11/30 10:34

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054



VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 23 de 67



“PARQUE RECREODEPORTIVO LOS PATOS”

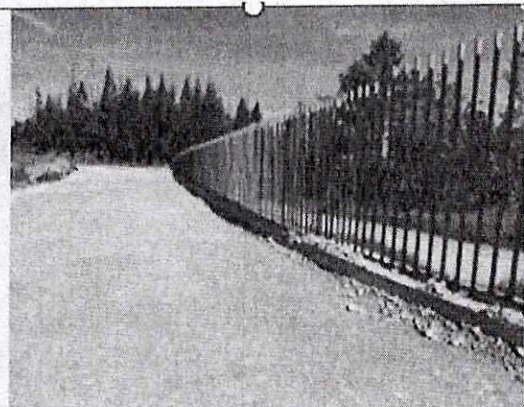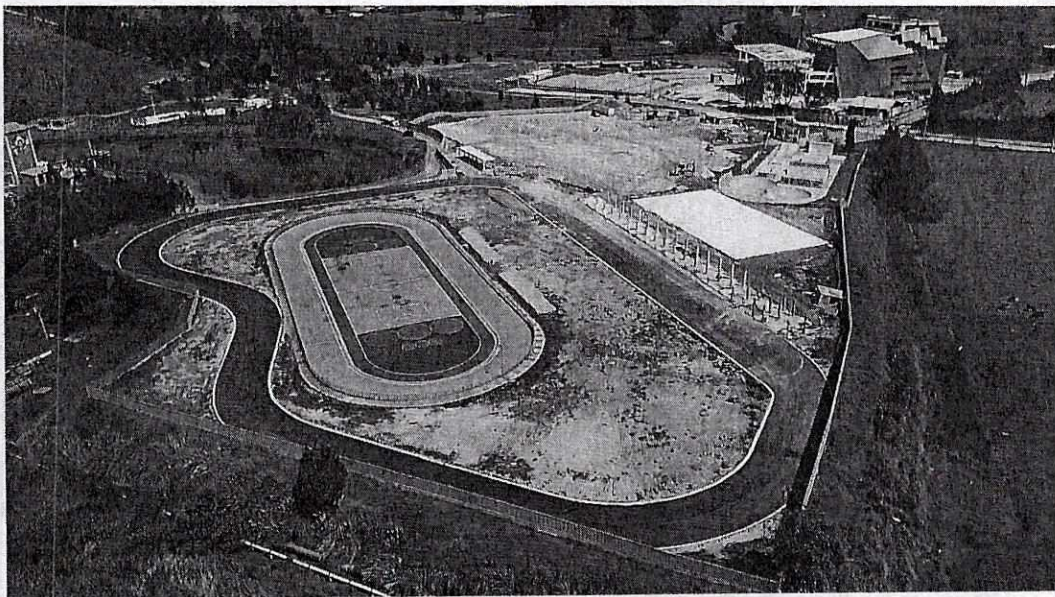


FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 24 de 67

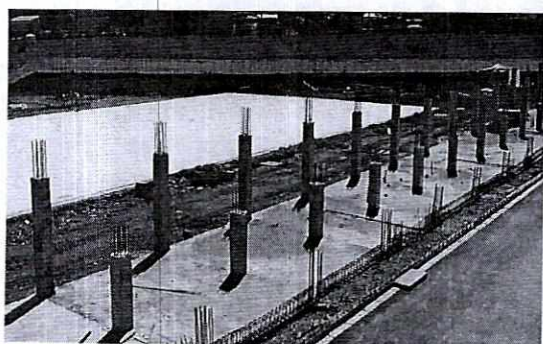

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE)

PRODUCTO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RECREO – DEPORTIVA).

CÓDIGO BPIN: 2020258170030

META DE PRODUCTO: estudios diseños y proyectos elaborados para infraestructura recreo – deportiva)


VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2021	1	1	100%
2022	1	1	100%
2023	2	2	100%

META CUATRIENIO: 4 estudios y diseños

AVANCE CUATRIENIO: 4 estudios y diseños..... 100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

en cumplimiento de este programa se realizó el ajuste a los diseños del parque recreodeportivo LOS PATOS, el escenario múltiple cultural, el cerramiento y espacio público de la cancha múltiple TORRES DE SAN JUAN y del parque recreo deportivo MILENIUM II





FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054


VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 25 de 67

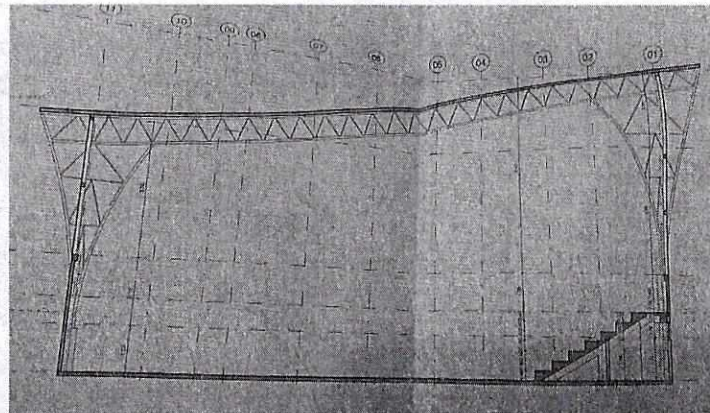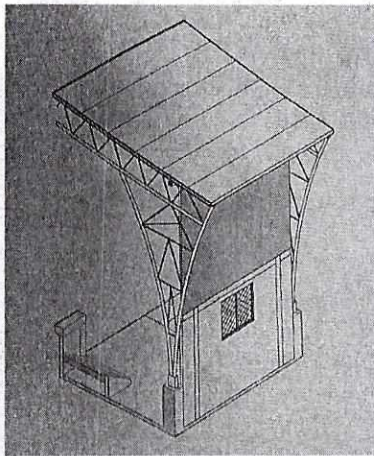


Se celebra CONTRATO ESPECÍFICO No. 2210741, que hace referencia al proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, para el cual se adelantan los diseños de la Pista de Ruta - Patinodromo, cancha de Hockey y Pista de BMX

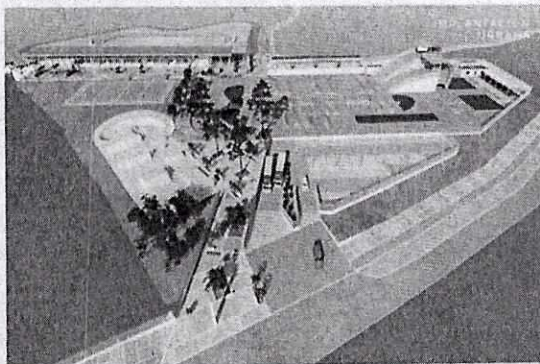

Parque Recreo-Deportivo Los Patos



Parque Recreo-Deportivo Los Patos



FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 26 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR BASICA Y MEDIA

PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MANTENIDA.

CÓDIGO BPIN: 2020258170035

META DE PRODUCTO: sedes mantenidas.

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	3	3	100%
2021	3	3	100%
2022	3	3	100%
2023	3	6	100%


META CUATRIENIO: 12 sedes

AVANCE CUATRIENIO: 12 sedes.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se realizaron diversas intervenciones de mantenimiento con carácter preventivo y/o correctivo con el personal adscrito a esta secretaria en todas las instituciones educativas y más recientemente en: técnico Comercial, San Luis Gonzaga, Antonia Santos, La Fuente, San Victorino, Industrial).

Adicionalmente se adelantaron contratos cada año de la vigencia para el mantenimiento de las sedes, priorizando en coordinación con la secretaria de educación las necesidades de las mencionadas edificaciones.

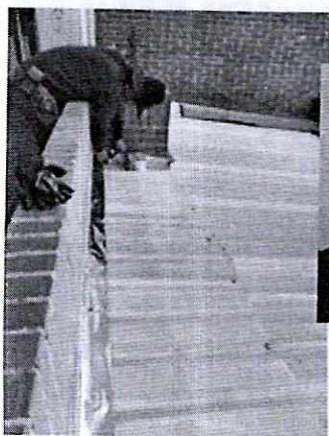

Escuela Buenos Aires



IED - La Fuente



Escuela La Esmeralda



FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 27 de 67

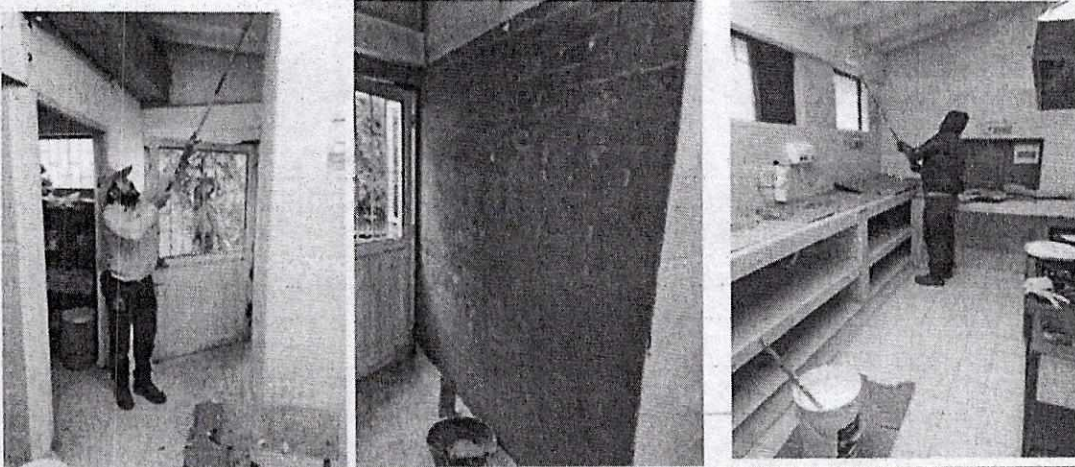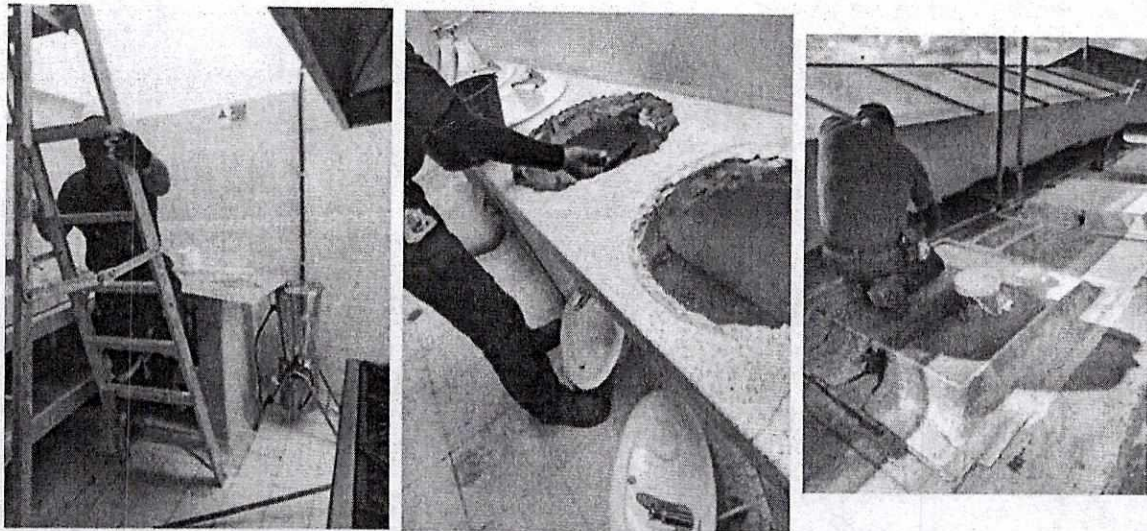

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR BASICA Y MEDIA
PRODUCTO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUIDA.
CÓDIGO BPIN: 2020258170035

META DE PRODUCTO: sedes educativas nuevas construidas.

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2021	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2022	1	1	100%
2023	1		100%

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 28 de 67



META CUATRIENIO: 2 sedes

AVANCE CUATRIENIO: 2 sedes.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se encuentra en construcción la primera etapa del centro de atención y educación inicial- vereda la fuente y en relación con el avance del colegio milenio el mismo se encuentra en la terminación de la primera etapa, y se adición la segunda etapa que garantiza su culminación.




COLEGIO MILENIO ETAPAS 1 y 2

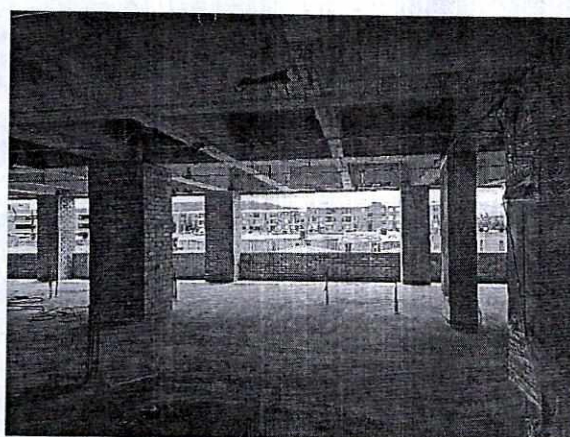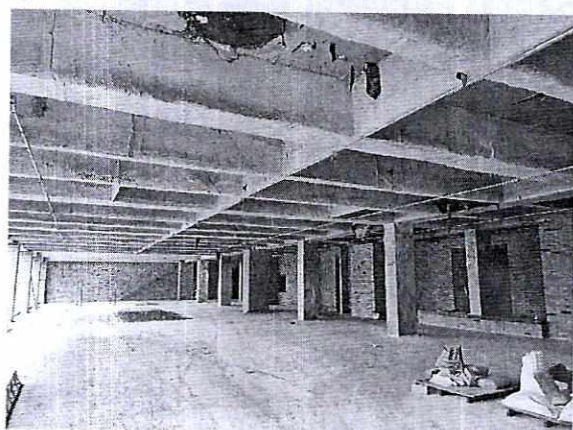

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054
VERSIÓN: 001
FECHA: SEPTIEMBRE 2023
Pág. 29 de 67

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA VEREDA LA FUENTE

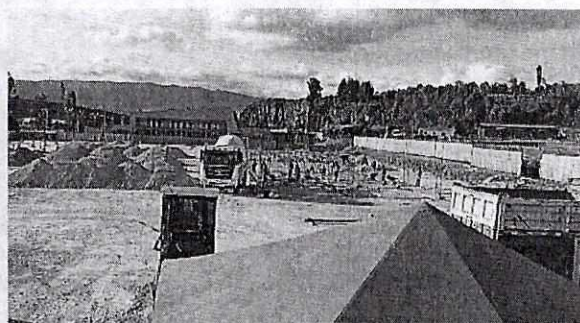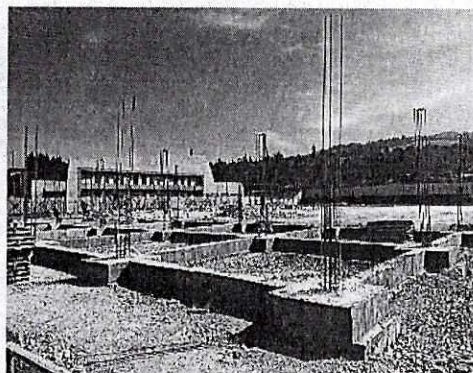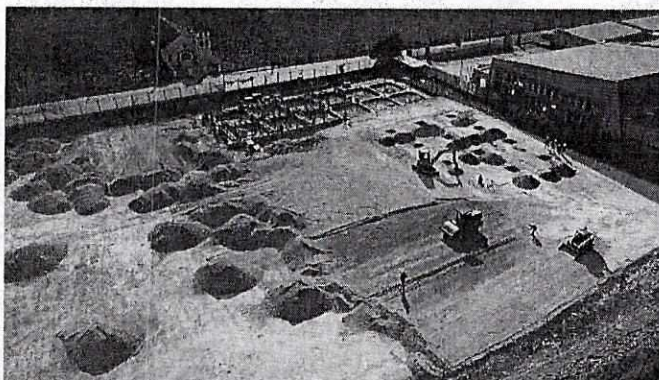

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS.

PRODUCTO: EDIFICACIONES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFRANCIA ADECUADAS.

CÓDIGO BPIN: 2020258170034

META DE PRODUCTO: edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas.

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	1	1	100%
2021	2	2	100%
2022	2	1	50%
2023	1	4	100%

META CUATRIENIO: 6 sedes

AVANCE CUATRIENIO: 6 sedes.....100%

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054




VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 30 de 67

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se realizó la adecuación de las siguientes edificaciones de atención a primera infancia (La Megaludoteca, Vda La Fuente, Hogar Agrupado, San Miguel, Cabañita mágica, Caminos de Sie)

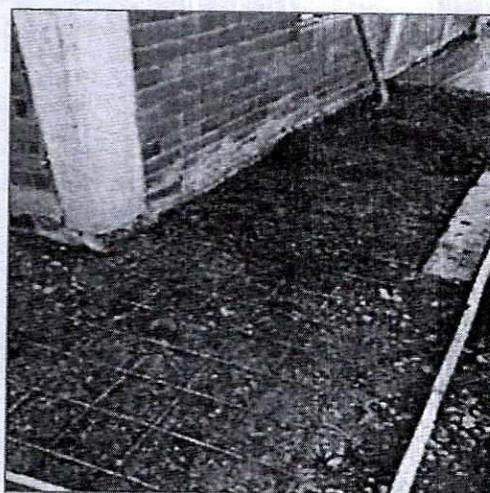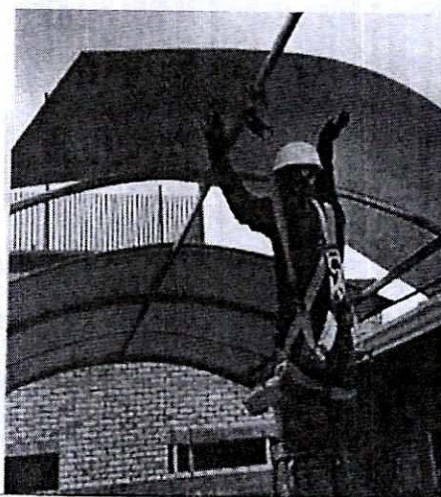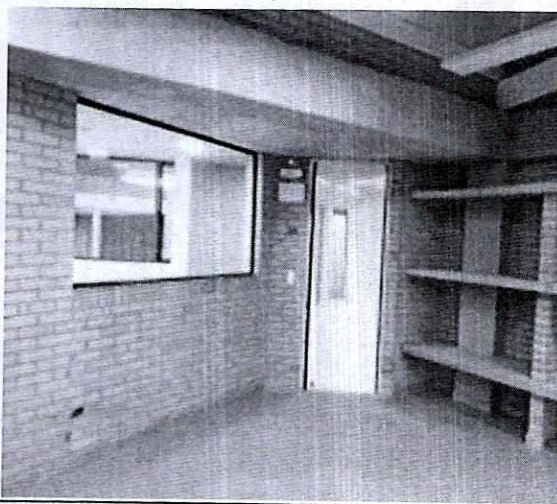

<p align="center">FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)</p>			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 31 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
PRODUCTO: HOSPITALES DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN ADECUADOS.
CÓDIGO BPIN: 2020258170028

META DE PRODUCTO: hospitales de primer nivel de atención adecuados.

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	1	1	100%
2021	NO PROGRAMADO		NO SE EVALUÁ
2022	NO PROGRAMADO	1	NO SE EVALUÁ
2023	NO PROGRAMADO	4	NO SE EVALUÁ

META CUATRIENIO: 1 U

AVANCE CUATRIENIO: 1 U.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se ejecutaron las obras correspondientes a la adecuación del hospital nuestra señora del tránsito y se dio al servicio en el año 2020 y construcción de la calle 12 la fue un requisito para la habilitación del hospital.



FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 32 de 67

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR.

PRODUCTO: CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSTRUIDOS Y DOTADOS.

CÓDIGO BPIN: 2020258170032

META DE PRODUCTO: centros de atención integral para personas con discapacidad contruidos y dotados



VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	0.20		NO SE EVALUÁ
2021			NO SE EVALUÁ
2022	0.20	0.20	NO SE EVALUÁ
2023	0.60	0.60	NO SE EVALUÁ

META CUATRIENIO: 1 U





AVANCE CUATRIENIO: 20 %

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se recibió por parte de Colsubsidio el diseño arquitectonico y está en ejecución el contrato de los estudios técnicos pertinentes (estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico, sonido, fotometría etc.) con el inconveniente que a la fecha el predio no ha sido entregado formalmente al municipio mediante escritura pública y carece de norma urbanística para su aprobación.

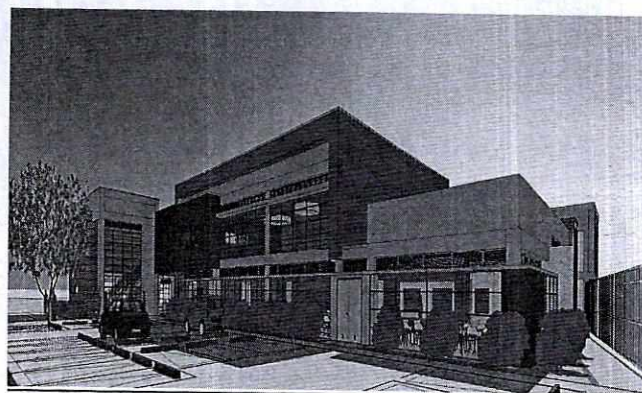

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

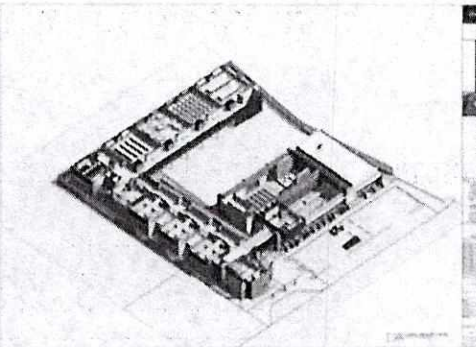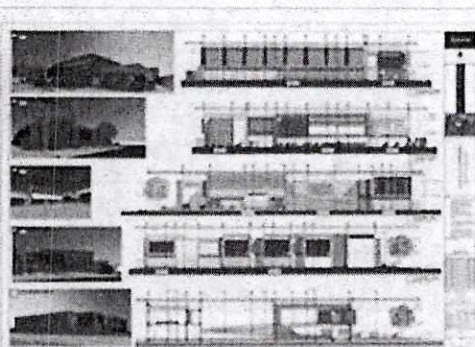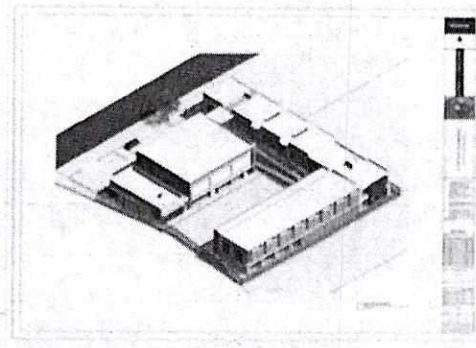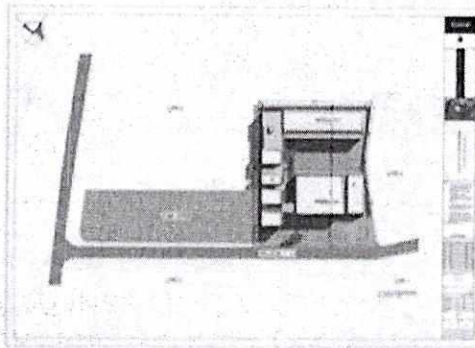CÓDIGO: GES-F-054
VERSIÓN: 001
FECHA: SEPTIEMBRE 2023
Pág. 33 de 67


ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS
CULTURALES Y ARTÍSTICOS
PRODUCTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRESTRUCTURA
CULTURAL.
CÓDIGO BPIN: 2020258170036

META DE PRODUCTO: infraestructura cultural intervenida (4 bibliotecas, casa de la cultura y ciudadela cultural)

VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	1	1	100%
2021	1	1	100%
2022	2	2	100%
2023	2	2	100%

META CUATRIENIO: 6 edificaciones

AVANCE CUATRIENIO: 6 edificaciones.....100%

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001



FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 34 de 67




ACTIVIDADES REALIZADAS:

se ejecutaron las actividades propias del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los edificios de uso cultural en las siguientes edificaciones(Casa de la Cultura, Ciudadela Cultural, Biblioteca Ana Estela Gómez de Char, Biblioteca Pedro María Ortega, Biblioteca Canavita y Biblioteca Roberto González Otero).mediante contratos anuales suscritos para tal efecto, adicionalmente a los contratos mencionados se ejecutan trabajos con la intervención del personal adscrito a esta secretaria.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

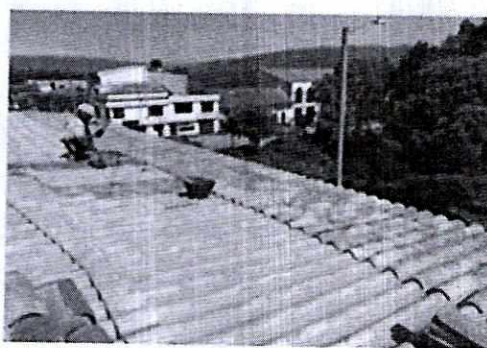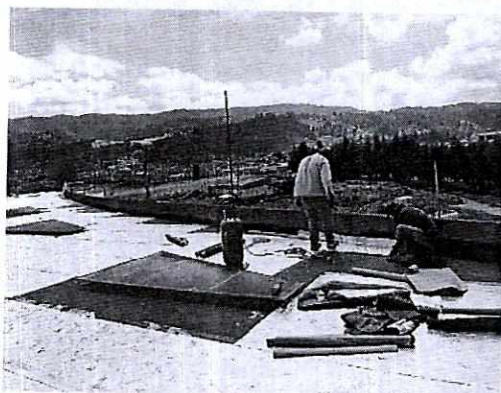

Mantenimiento Cubierta Casa de la Cultura

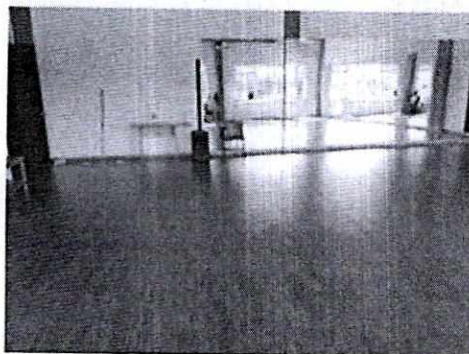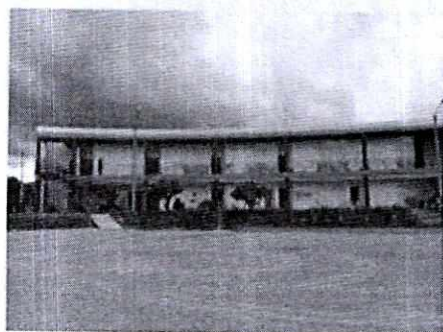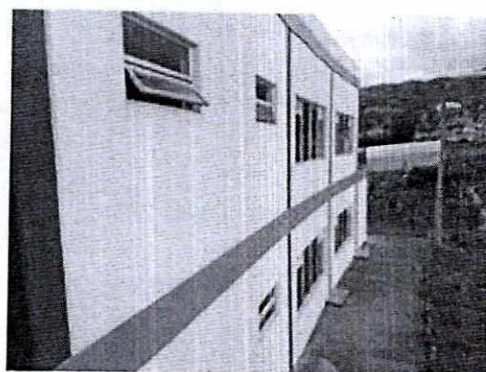

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)


CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 35 de 67

MANTENIMIENTO E IMPREMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE LA CIUDADELA CULTURAL ADECUACIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN.

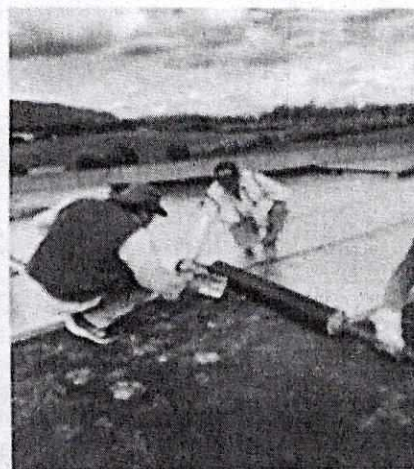

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS
CULTURALES Y ARTÍSTICOS
PRODUCTO: CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y DOTADOS.
INDICADOR DE PRODUCTO: : CENTROS CULTURALES CONSTRUIDOS Y
DOTADOS (AUDITORIO REGIONAL).
CÓDIGO BPIN: 2020258170036

META DE PRODUCTO: centros culturales construidos y dotados (auditorio regional)

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 36 de 67


VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	0.16	0.00	0%
2021	0.52	0.52	100%
2022	0.16	0.16	100%
2023	0.16	0.16	100%

META CUATRIENIO: 1 U

AVANCE CUATRIENIO: 1 Unid.....100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se encuentra en ejecución el proyecto denominado "CENTRO CULTURAL VERGANZO" el cual se encuentra en etapa de cimentación y estructura, igualmente se continúa con la CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO REGIONAL etapa 1 y etapa 2 con un avance del 90% en cada etapa, es importante tener en cuenta que esta obra requiere recursos adicionales para su terminación.

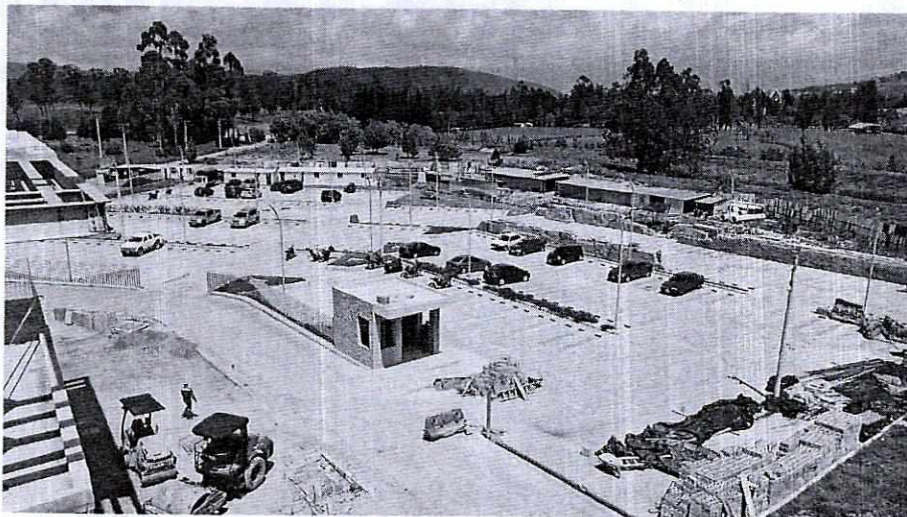




FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054


VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 37 de 67

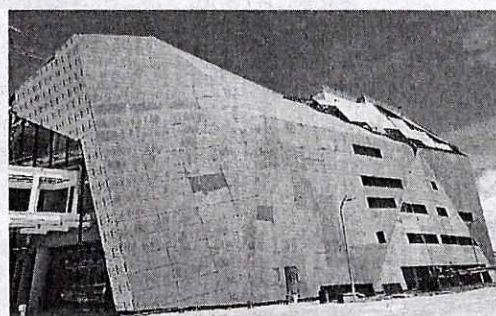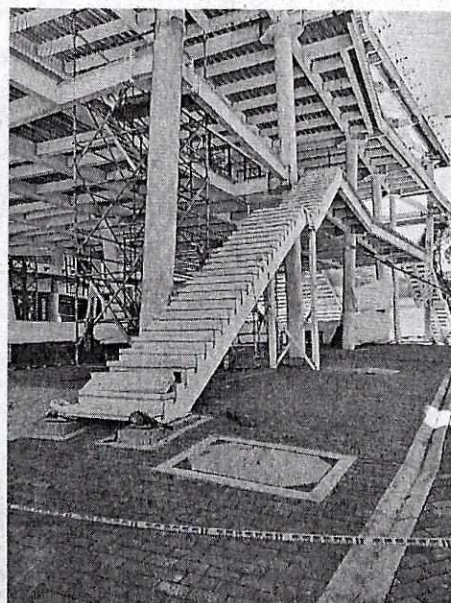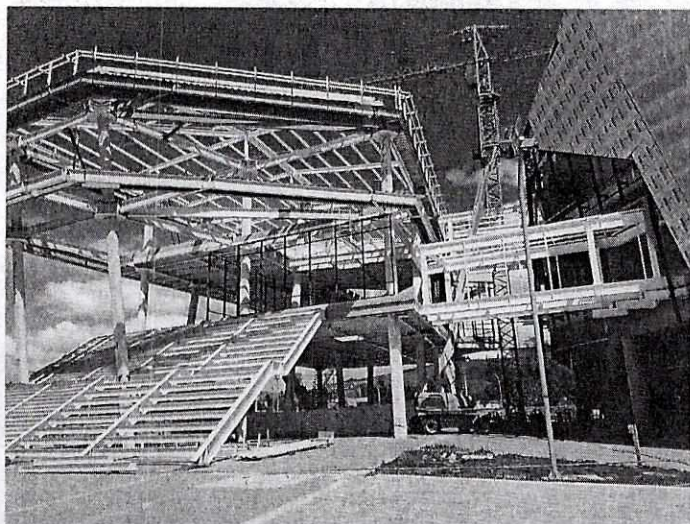


ACTIVIDADES EDIFICIO PRINCIPAL –ETAPA 1

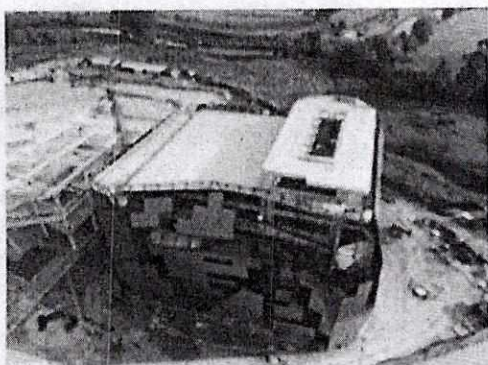

Fachada n°2



Fachada n°4

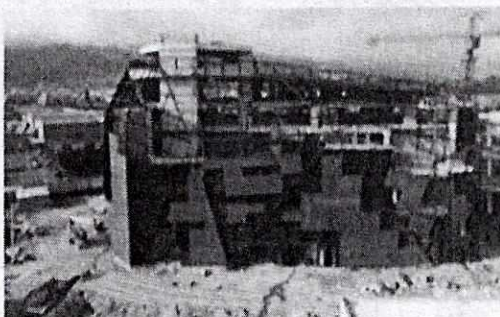

Fachada n°3


FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054



VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023



Pág. 38 de 67

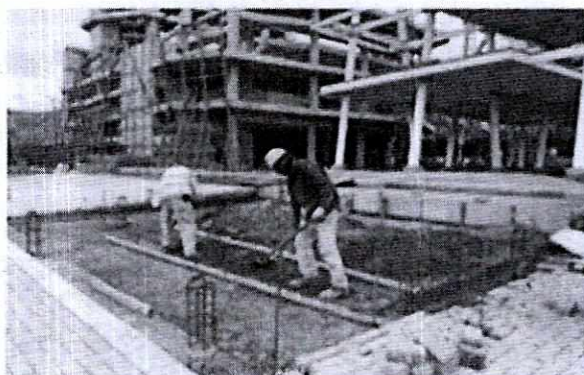

CENTRO CULTURAL - VERGANZO

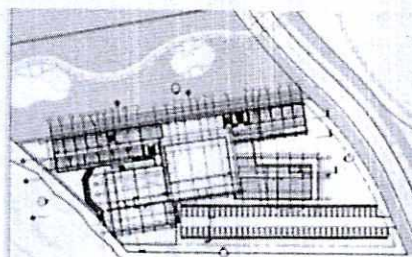

Centro cultural se encuentra en ejecución
en sus actividades preliminares y de
cimentación

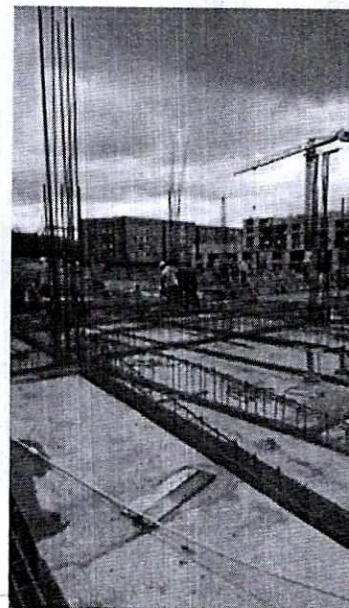

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 39 de 67



ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGIA ELECTRICA

PRODUCTO: REDES DE ALUMBRADO PUBLICO AMPLIADAS Y MANTENIDAS.

CÓDIGO BPIN: 2020258170031

META DE PRODUCTO: modernización luminarias.


VIGENCIA	META PROGRAMADA	AVANCE	% AVANCE
2020	610	610	100%
2021	1000	1000	100%
2022	1000	4261	100%
2023	1000	4200	100%

META CUATRIENIO: 3610 luminarias

AVANCE CUATRIENIO: 4200 luminarias..... 100%

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se ejecutaron actividades propias de ampliación y mantenimiento de las redes de alumbrado público con la modernizaron 4200 luminarias, tanto en el área rural como urbana de acuerdo con la labor adelantada por la empresa de economía mixta GETSA.

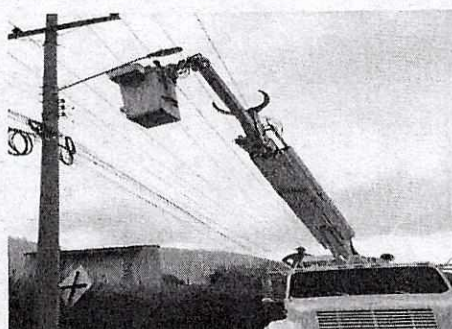


FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 40 de 67

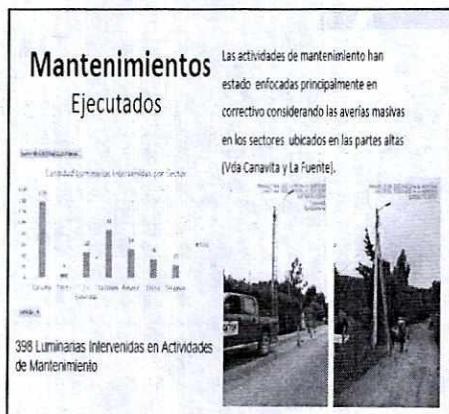

ACTIVIDADES ADICIONALES

- Recomendaciones diurnas y nocturnas para identificación de luminarias en falla (Semanal).
- Pruebas Piloto con Luminarias Tipo Led mejoradas y refuerzo con sistemas de puesta a tierra en la red para evaluar desempeño. Iniciadas el 11 de Abril de 2022.
- Reparación de iluminación Carrera 8 - Poste Tipo Histórico en Sodio (Abril 2022)

Enel continúa presentando facturas por arrendamiento de infraestructura de alumbrado público con cargo a la cuenta 0863006-5 y el Municipio continúa haciendo devolución de estas teniendo en cuenta que la fecha no existe entre las partes (Enel Codensa y Municipio de Tocancipá), relación contractual (convenio y/o contrato) de arrendamiento de infraestructura de Alumbrado Público, puesto que dicha relación jurídica tuvo vigencia hasta el 31 de mayo de 2020.

La devolución más reciente se presenta se realizó mediante oficio SI – 1319 – 2023 de fecha 20 de noviembre de 2023:

Número de factura	DESDE	HASTA	Valor Energía	Valor Arrendamiento	IVA	Intereses	Ajuste	Saldo Anterior	Total Factura
116174182-7	1/oct/2023	31/oct/2023		94.579.817,00		95.724.985,00	-2,00	5.747.047.670,00	5.937.352.470,00

De manera paralela el Municipio, Enel, GETSA SAS y la interventoría han venido realizando mesas de trabajo con el objeto de lograr depurar las bases de datos del inventario de infraestructura de alumbrado público en territorio municipal.

De conformidad con el informe presentado por GETSA para el mes de octubre, el inventario actual de luminarias es de 4366, las cuales de manera permanente son objeto de monitoreo y mantenimiento.

GETSA® <small>Expertos en Soluciones Inteligentes</small>		LUMINARIAS LED 4366	
		TRAZABILIDAD PQR'S	
MES	PQR'S MENSUALES	LUMINARIAS REPARADAS EN ZONA URBANA	LUMINARIAS REPARADAS EN ZONA RURAL
ENERO	7	8	4
FEBRERO	9	24	5
MARZO	7	17	4
ABRIL	6	3	3
MAYO	8	5	17
JUNIO	3	0	3
JULIO	5	1	6
AGOSTO	9	9	8
SEPTIEMBRE	8	3	9
OCTUBRE	2	3	0

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 42 de 67

RESUMEN CONSOLIDADO AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL 2020 - 2023

*Datos tomados del reporte de Planeación en Consejos de Gobierno

EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO CUATRIENIO (Corte 31 de octubre de 2023)

Avance 2020				
No.	Línea Estratégica	Dependencia	\$Ejecución presupuestal	% Ejecución Presupuestal
7	Avancemos en	Planeación	\$ 82,583,922.00	2.79
8	Desarrollo	Infraestructura	\$ 4,585,170,275.00	67.15
9	Territorial	Servicios Públicos	\$ 1,266,344,567.00	74.86

Avance 2021				
No.	Línea Estratégica	Dependencia	\$ Ejecución presupuestal	% Ejecución Presupuestal
7	Avancemos en	Planeación	\$ 5,285,380,268.00	48.83
8	Desarrollo	Infraestructura	\$ 14,475,194,138.31	76.79
9	Territorial	Servicios Públicos	\$ 3,379,567,308.84	80.82

Avance 2022				
No.	Línea Estratégica	Dependencia	\$ Ejecución presupuestal	% Ejecución Presupuestal
7	Avancemos en	Planeación	\$ 3,736,627,236.00	18.76
8	Desarrollo	Infraestructura	\$ 68,124,549,802.00	91.34
9	Desarrollo Territorial	Servicios Públicos	\$ 2,941,915,784.00	79.26

Avance Financiero 2023*				
No.	Línea Estratégica	Dependencia	\$ Ejecución presupuestal	% Ejecución Presupuestal
7	Avancemos en	Planeación	\$ 9,053,675,337.00	49.33
8	Desarrollo	Infraestructura	\$ 50,866,651,408.98	86.63
9	Territorial	Servicios Públicos	\$ 9,984,298,194.00	90.86

El porcentaje de ejecución presupuestal anteriormente indicado por vigencia se refiere a la relación de inversiones ejecutada sobre las metas indicadas en el Plan de desarrollo municipal, no obstante, lo anterior, la secretaria de infraestructura invirtió la totalidad de los recursos por vigencia, adicionándolos a las obras que se encontraban en ejecución durante la respectiva vigencia.

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 41 de 67
-------------------	--------------	------------------------	---------------

La energía de este alumbrado público actualmente la suministra EPM y la paga GETSA SAS. mediante el contrato interadministrativo CT-2020-000424.

Por ahora con ENEL se continúa con las cuentas de alumbrado para el parque (4506440) y puente autódromo, mientras se hace la migración correspondiente, tema en el que se está trabajando con la SEM y la INTERVENTORÍA.

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 43 de 67

ESTADÍSTICAS GENERALES

La siguiente es la información estadística consolidada de diferentes áreas y actividades dentro del municipio, a fin de aportar como líneas base para la consolidación de metas en el futuro plan de desarrollo.

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES		
USO	DESTINACIÓN	LOCALIZACIÓN
ZONAS VERDES	PLAZOLETAS	PARQUE PRINCIPAL
		PLAZOLETA "EL RESBALON"
		PLAZOLETA CAMINO AL MEDIO
		PLAZOLETA ANTONIA SANTOS
		GLORIETA CAMINO AL MEDIO
		GLORIETA EMGETSA
		GLORIETA MILENIUM
		PARQUE LINEAL MANANTIAL
		PARQUE LOS PATOS
	ZONAS VERDES	SENDEROS PEATONALES CAMNOS DEL GONE
		ZONA VERDE URB LA ESTACIÓN
		ZONA VERDE ENTRADA AL COLEGIO INDUSTRIAL
		SENDEROS PEATONALES CAMNOS DEL GONE
		ZONA VERDE SAN JUAN
		ZONA VERDE MILENIUM
		ZONA VERDE URBA LAS PALMAS
		ZONA VERDE URB LA ESMERALDA
		ZONA VERDE ROCAS DE SEVILLA
		ZONA VERDE VILLA TOCARINDA
		ZONA VERDE URB LOS ALPES
		ZONA VERDE URB MIRADOR DE LOS ALISOS
		ZONA VERDE URB SAN CARLOS
		ZONA VERDE URB LA ARBOLEDA

EDIFICIOS INSTITUCIONALES		
USO	DESTINACIÓN	LOCALIZACIÓN
SALONES COMUNALES	PORVENIR	SALON COMUNAL
	LA FUENTE	CENTRO POBLADO
	VERGANZO	MILENIUM
	CANAVITA	DULCINEA
EDIFICIOS INSTITUCIONALES	AREA URBANA	PALACIO MUNICIPAL
		PUESTO DE SALUD
		CASA DE JUSTICIA
		EDIFICIO BLANCO
		MEGALUDOTECA
	VERGANZO	ESTACION DEL TREN
		CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC
		CASA ADULTO MAYOR
		COMEDOR COMUNITARIO LA FUENTE
		CASA DE LA JUVENTUD
		CASA DE LA MUJER - CASA ROSALES

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 44 de 67

EDIFICIOS INSTITUCIONALES		
USO	DESTINACIÓN	LOCALIZACIÓN
EDIFICIOS PARA LA PRIMERA INFANCIA	AREA URBANA	SAN MIGUEL - CABAÑITA MAGICA
	AREA URBANA	MEGA HOGAR
	LA FUENTE	FUENTE
	VERGANZO	HOGAR AGRUPADO
	VERGANZO	MIENIUM
	CANAVITA	DULCINEA
EDIFICIOS INSTITUCIONALES	AREA URBANA	CASA DE LA CULTURA
	AREA URBANA	CIUDADELA CULTURAL
	VERGANZO	BIBLIOTECA ANA ESTELA GOMEZ DE CHAR
	LA FUENTE	BIBLIOTECA PEDRO MARIA ORTEGA
	CANAVITA	BIBLIOTECA CANAVITA
	CENTRO	BIBLIOTECA ROBERTO GONZALEZ OTERO

PARQUES ZONAS DEPORTIVAS Y BIOSALUDABLES

DESTINACIÓN	LOCALIZACIÓN
PARQUES INFANTILES	VILLA OLIMPICA
	SAN MIGUEL
	URBANIZACIÓN LA ESMERALDA
	SAN CARLOS
	LA AURORA
	ARBOLEDA
	ALISOS
	SAN MIGUEL
	ESCUELA BUENOS AIRES
	SAN JAVIER
	TOLIMA
	LA ESTACION
	SAN JUAN
	LA DIANA
	LAS QUINTAS
	ESCUELA ESMERALDA

DESTINACIÓN	LOCALIZACIÓN
ZONAS DEPORTIVAS	VILLA OLIMPICA
	CANCHAS VIA FERREA
	CANCHA SALON COMUNAL LA AURORA
	CANCHA URBANIZACIÓN LOS ALPES
	CANCHA PARTE ALTA BUENOS AIRES
	CANCHA SALON COMUNAL SAN VICTORINO
	CANCHA URBANIZACIÓN SAN JAVIER
	CANCHA ESCUELA EL PORVENIR
	SKATE PARK
	PATINODROMO

DESTINACIÓN	LOCALIZACIÓN
PARQUES BIOSALUDABLES	VILLA OLIMPICA
	SAN CARLOS
	ESCUELA LA ESMERALDA
	SAN MIGUEL
	SAN JAVIER
	TORRES DE SAN JUAN
	BUENOS AIRES
	LOS CEREZOS
	SALON COMUNAL LA FUENTE

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 45 de 67

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

a. Recursos Financieros

El siguiente es el presupuesto proyectado para la vigencia 2024 de la secretaria de infraestructura municipal.

CODIGO	NOMBRE PROYECTO	VALOR
202258170028	ADECUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL HOSPITAL DEL MPIO	\$50,000,000
202258170029	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL MPIO	\$200,000,000
202258170030	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	\$300,000,000
202258170031	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$5,201,000,000
202258170032	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL	\$0
202258170033	ADECUACIÓN DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MPIO	\$450,000,000
202258170034	ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA	\$100,000,000
202258170035	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MPIO.	\$2,092,941,084
202258170036	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MPIO.	\$1,642,941,084
202258170037	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL MUNICIPAL	\$3,212,000,000
VALOR TOTAL		\$13,248,882,168
VALOR (menos lo destinado a alumbrado público)		\$8,047,882,168

En lo pertinente a la relación de obligaciones financieras que tenga la secretaria pendiente a 31 de diciembre de 2023 (Cuentas por pagar, Reservas, pasivos exigibles, entre otros), será entregada oportunamente por la secretaria de hacienda municipal una vez consolide dicha información.

b. Bienes muebles e inmuebles

- En relación con los bienes inmuebles en particular para esta secretaria, no aplica.
- Lo correspondiente al inventario a corte 31 de diciembre de 2023, del aplicativo Sysman y certificado de Paz y Salvo suscrita por el almacenista General y el soporte del backup realizado al equipo de cómputo se entregará en la última semana del mes de diciembre.
- La siguiente es la relación de los números de líneas telefónicas a cargo de la secretaria y el responsable:

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 46 de 67
--------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

No. De Línea Telefónica	Responsable	Programa o Dependencia a Cargo
3208369391	Jenny Alexandra Triviño	Secretaría de Infraestructura.
3183353335	Ing Mario Suanca Pulido	Secretaría de Infraestructura.

Vehículos a cargo

La siguiente es la relación de vehículos (incluye maquinaria) adscrita a la secretaría de infraestructura

RELACIÓN DE VEHICULOS - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCION	MARCA	PLACA	REFERENCIA	MODELO	FUNCIONARIO A CARGO
VOLQUETA	VOLKSWAGEN	ODR731	17220	2015	CARLOS F VELASQUEZ
VOLQUETA	VOLKSWAGEN	ODR732	17220	2015	MIGUEL FDO MORENO
RETROEXCAVADORA	TEREX	N.A	TX760B		MAURICIO ROZO
RETROEXCAVADORA	FAI	N.A	905-965		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE BAJA
MOTONIVELADORA	GALION	N.A			QUERUBIN SANCHEZ
MOTONIVELADORA	TEREX	N.A	TG140		RAMIRO GARZON A
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC	N.A	CA150D		ROLANDO RAMIREZ
CAMIONETA	CHEVROLET	OBH404	D-MAX	2009	RODOLFO ROCHA

La información particular de todos y cada uno de los vehículos se encuentra consignada en las carpetas individuales denominadas "hojas de vida por vehículo" que reposan en la secretaría administrativa, igualmente en esta secretaria se dispone copia de estas en medio físico y magnético.

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 47 de 67

4. PLANTA DE PERSONAL

A continuación, se relaciona la planta de personal con que cuenta la secretaria de Infraestructura:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	COMPENSATORIOS PENDIENTES (SI / NO)-# de días	VACACIONES PENDIENTES (SI / NO) periodos pendientes:	FECHA DE CORTE DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (Aplica para los de Carrera Administrativa)
MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	LIBRE NOMBRAMIENTO		SI / 2	N/A
HUGO G ESPINOSA SEPULVEDA	Director Técnico	LIBRE NOMBRAMIENTO		SI / 2	N/A
YENI ALEXANDRA TRIVIÑO	AUX. ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD		SI / 2	N/A
OSCAR JAVIER PARADA AVELLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E) GRADO 1	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/ 2	
EDGAR BARRETO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/ 2	
LUIS ANTONIO RODRIGUEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI / 1	
JOSE MAURICIO RODRIGUEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/ 2	
HERNANDO VALLEJO OBANDO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI / 1	
SONIA MERCEDES RODRIGUEZ SARMIENTO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 4	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI / 1	
OSCAR PRIAS	TECNICO OPERATIVO	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/ 2	
RODOLFO ROCHA	CONDUCTOR MECANICO	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/1	
QUERUBIN SANCHEZ	CONDUCTOR MECANICO	CARRERA ADMINISTRATIVA		AL DIA	
MIGUEL FERNANDO MORENO	CONDUCTOR	CARRERA ADMINISTRATIVA		NO	
CARLOS FRANCISCO VELASQUEZ	CONDUCTOR	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/1	

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 48 de 67
--------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

RICARDO GONZALEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARRERA ADMINISTRATIVA			
ORLANDO SOLER	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/2	
MARIO NOVOA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/1	
MIGUEL ANGEL GALVIS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/2	
CESAR ROLANDO RAMIREZ	CONDUCTOR MECANICO	CARRERA ADMINISTRATIVA		AL DIA	
MAURICIO ROZO GOMEZ	CONDUCTOR MECANICO	CARRERA ADMINISTRATIVA			
RAÚL ALBEIRO JIMENEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	CARRERA ADMINISTRATIVA		SI/2	
YERFERSON RODRIGUEZ G	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PROVISIONALIDAD			

Dentro del estudio de cargas laborales y una vez identificadas las necesidades específicas en lo pertinente al recurso humano adscrito a esta secretaria, se pudo identificar la necesidad de complementar dicho recurso tanto en la parte administrativa como operativa con los siguientes perfiles y actividades específicas:

- **ABOGADO:** como apoyo a temas contractuales y demás procesos y conceptos jurídicos.
- **PROFESIONAL FINANCIERO:** administrador que se encarga de seguimiento a plan de desarrollo y los tramites presupuestales.
- **GESTION DE PROYECTOS:** perfil de arquitecto para efecto de adelantar el seguimiento y trámite ante entidades para gestión de recursos y demás actividades propias en arquitectura.
- **PROFESIONAL SISO:** apoyo para control de salud y seguridad en el trabajo en la ejecución de las diferentes obras y al personal propio.
- **TOPOGRAFO:** apoyo para control de niveles, trazados de las obras: levantamiento de predios y vías para proyectos nuevos y demás actividades administrativas propias de esa área.
- **PROFESIONAL AREA AMBIENTAL:** apoyo a control de las diferentes intervenciones y obras en aspectos ambientales.

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 49 de 67

➤ **PERSONAL OPERARIO DE MAQUINARIA:**

se requiere complementar los conductores acordes al del parque automotor existente, igualmente dos operarios más de apoyo al mantenimiento vial y espacio público.

En consideración al anterior análisis y a la planta existente se propuso el siguiente organigrama a efecto de fortalecer la secretaria de infraestructura municipal acorde a la dimensión y el crecimiento actuales del municipio.



5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

A continuación, se relaciona los programas, estudios y proyectos formulados por la secretaria por vigencias: (listado de bancos de proyectos a cargo), (en caso de no tener a cargo colocar NO APLICA)

PROYECTO COD BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSION	ENTIDAD QUE PRESENTO EL PROYECTO	EJECUTADO O EN PROCESO	VIGENCIA	NOMBRE DEL FORMULADOR OFICIAL
ICCU-CTO- 1194 DE 2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE, SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA	\$250,000,000	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	CONVENIO SUSCRITO	2023	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 50 de 67

ICCU-CTO-1193 DE 2023	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO, SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	\$250,000,000	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	CONVENIO SUSCRITO	2023	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CVO007-2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REPOSICION, Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR LOS PATOS, Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	\$1,276,344,567	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP	TERMINADO SIN LIQUIDACIÓN	2020	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
005CTOINT-2021	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	\$60,000,000	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP	TERMINADO	2021	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CTO ESPECIFICO No.2210741	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	20.000.000.000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio	EN EJECUCIÓN	2021	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CVOINT 003 MT 2022	AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	\$133,000,000	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP	EN EJECUCIÓN	2022	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

los convenios interadministrativos números: "CTO-1193 de 2023 y CTO-1194 de 2023" suscritos con el Instituto de Construcciones de Cundinamarca ICCU están pendientes de su iniciación.

La secretaría de infraestructura participa en la política pública y de inclusión social para personas con discapacidad dentro de la cual se adelanta el plan de acción que ejecuta acciones específicas que determina el comité municipal en tal sentido.

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 51 de 67

6. OBRAS PÚBLICAS

A continuación, se relacionan todas y cada una de las obras públicas adelantadas por la secretaria de Infraestructura, pero que beneficia a esta secretaria señalando si está en ejecución o en proceso.

El mencionado listado incluye los contratos suscritos en las vigencias 2020, 2021, 2022, 2023 y adicionalmente los contratos que al inicio de la actual administración fueron recibidos por cuanto se encontraban en ejecución y suscritos en años anteriores al año 2020.

EL listado incluye la siguiente información específica:

- Objeto del contrato
- Razón social o nombre del contratista de obra
- Razón social o nombre del contratista de interventoría
- Estado actual del contrato
- Observaciones.

Dispuesto acorde al siguiente formato:

OBJETO DE LA OBRA	NOMBRE RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE RAZON SOCIAL DE INTERVENTORÍA	ESTADO		OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	

Ver **anexo numero 1** denominado Relación de Contratos de obras públicas 2020 - 2023 cuatrienio (secretaria de Infraestructura)

7. CONTRATACIÓN 2020 – 2023

Se adjunta en un Anexo a corte 31 de diciembre de 2023, de la relación de la totalidad de la contratación suscrita por vigencias de esta Secretaría, relacionando el estado de ejecución

El listado por vigencias incluye la siguiente información específica:

- número del contrato
- Dependencia
- Objeto del contrato.
- Nombre del contratista.
- Valor total del contrato.
- Estado de la liquidación del contrato.

Dispuesto acorde al siguiente formato:

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 52 de 67

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	REQUIERE LIQUIDACION DEL CONTRATO
---------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------------

Ver anexo numero 2 denominado contratación total 2020 – 2023 secretaria de infraestructura

8. COMITÉS DE LOS QUE HACE PARTE O PARTICIPA LA SECRETARÍA

La siguiente es la relación de los comités en los cuales tiene participación la secretaria de infraestructura, sin tener en ninguno de ellos la secretaria técnica.

CONSEJOS, COMITÉS Y/O MESAS TÉCNICAS						
CONSEJO, COMITÉ Y/O MESA TÉCNICA	TIPO Y No. ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE EMISIÓN	ASUNTO y/o OBSERVACIÓN	COORDINACIÓN O SECRETARÍA TÉCNICA	CONTACTO	ESTADO
COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL	Decreto 051	16 de junio de 2021	Por el cual se crea el comité territorial de justicia transicional del municipio de Tocancipá y se derogan los decretos 060 de 2012 y el 092 de 2013, los cuales modificaron el CTJT, y se dictan otras disposiciones	Secretaría de Gobierno Alcaldía Municipal de Tocancipá	Secretaria de Gobierno Alcaldía Municipal de Tocancipá	Activo
COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	Decreto 033	26 de marzo de 2019	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Municipal 076 del 24 de noviembre de 2014, con relación al traslado de la Secretaría Técnica del comité para la atención integral a la población vulnerable con discapacidad del municipio de Tocancipá	Secretaría de Salud Alcaldía Municipal de Tocancipá	Secretaria de Salud	Activo
FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y REFORMA URBANA	Acuerdo 007	17 de junio de 2020	Por el cual se modifica el fondo municipal de vivienda y reforma urbana de	Secretaría de Planeación Alcaldía Municipal de Tocancipá	Secretaria de Planeación Alcaldía	Activo
CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL	Acuerdo No. 014 de 2014	1/08/2014	Por el cual se modifica el Acuerdo No. 018 de 2008 sobre la integración y funciones del Consejo Municipal de Política Social y se dictan otras disposiciones	Secretaría Técnica: Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Secretaria de Desarrollo e Integración Social	Activo
COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL	Decreto No. 035 del 2012 Decreto No. 079 de 2012 Decreto No. 107 del 2021	08/05/2012 17/12/2012 02/12/2021	Por el cual se crea el Comité de Justicia Transicional de Tocancipá y se dictan otras disposiciones. Por medio del cual se establece la estrategia, responsables y tiempos para el reporte unificado del sistema de información, coordinación y seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado interno - RUSICST del municipio de Tocancipá y se dictan otras	Coordinación: Secretaría de Desarrollo Social Secretaría Técnica: secretaria de Gobierno	Secretaria de Desarrollo Social	Activo

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054
VERSIÓN: 001
FECHA: SEPTIEMBRE 2023
Pág. 53 de 67

			disposiciones. Por el cual se deroga el Decreto No. 051 del 16/06/2021 y se modifica el Decreto No. 035 del 08/05/2012 que crea el comité Territorial de Justicia Transicional del municipio de Tocancipá			
MESA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Acuerdo No. 014 de 2014	41852	Por el cual se modifica el Acuerdo No. 018 de 2008 sobre la integración y funciones del Consejo Municipal de Política Social y se dictan otras disposiciones	Secretaría Técnica. Secretaría de Desarrollo e Integración Social	Secretaría de Desarrollo Social	Activo
CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO	Acuerdo No 015 de 2014	10/09/2014	Por medio del cual se crea el Consejo Consultivo de Turismo del Municipio de Tocancipá (CCTM) y se dictan otras disposiciones	Secretaría de Desarrollo Económico - Área de Turismo	Secretaría de Desarrollo Económico	Activo
SUBCOMITÉ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO	Decreto 107 de 2021	02 de diciembre de 2021	"POR EL CUAL SE DEROGA EL DECRETO 051 DEL 16 DE JUNIO DE 2021 Y SE MODIFICA EL DECRETO 035 DEL 8 DE MAYO DE 2012 QUE CREA EL COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"	Secretaría técnica: secretaria Administrativa	secretaria Administrativa	
JUNTA DE GOBIERNO			periodicidad: una vez al mes		secretaria Administrativa	Activo
JUNTA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO			periodicidad: según programación			Activo
COMITÉ DE CONVIVENCIA MUNICIPAL	Decreto 075 de 2014 Decreto 050 de 2022	21/11/2014 11/05/2022	Por el cual se crea el comité municipal de convivencia escolar en el municipio de Tocancipá	Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	Activo
JUNTA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS			periodicidad: mínimo cuatro (4) veces al año		EMSPT	Activo
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO				Secretaría de Gobierno Alcaldía Municipal de Tocancipá	<u>Secretaría de Gobierno Alcaldía Municipal de Tocancipá</u>	Activo
COMITÉ DE REDUCCION DEL RIESGO				Secretaría de Gobierno Alcaldía Municipal de Tocancipá	<u>Secretaría de Gobierno Alcaldía Municipal de Tocancipá</u>	Activo

Adicional al anterior listado se atiende reuniones por diversas actividades entre otras las más representativas son las siguientes:

- reuniones para colombianidad
- rendición de cuentas.
- informes de gestión.
- comités semanales de las diferentes obras que se estén adelantando.
- citaciones de control político ante el concejo municipal.

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 54 de 67

Finalmente sugiero considerar que se evalúe de manera particular la asistencia a algunos de los comités anteriormente indicados o la posibilidad de delegar la asistencia a los mismos a otro miembro del equipo, permitiendo así que el secretario pueda enfocarse en actividades más relevantes para el desarrollo físico del municipio. De esta manera, se optimizará el tiempo y los recursos disponibles, priorizando aquellas acciones y gestiones que realmente contribuyan al progreso y bienestar de la comunidad. Sin embargo, en caso de ser necesaria la presencia del secretario en alguna reunión para tratar temas puntuales o específicos, es fundamental que se notifique con anticipación para poder organizar adecuadamente las actividades y garantizar una atención eficiente.

9. INFORMES

A continuación, relaciono los diferentes informes que realiza la Secretaría de infraestructura ante entidades de carácter nacional indicando su asunto y periodicidad.

NOMBRE DEL INFORME	PERIODICIDAD	FECHA DEL REPORTE	ASUNTO	RESPONSABLE	ENTIDAD y/o SECRETARIA RECEPTORA	ESTADO ACTUAL
INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES - IPOC	semestral	29/06/2023	SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL INDICADORES Y DEL DIRECTORIO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DNI	Ing EDGAR BARRETO (secretaria de infraestructura)	DANE	REPORTADO
SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRONICA DE CUENTA E INFORMES - SIRECI	mensual	31/10/2023	SISTEMA DE INFORMACION Y REPORTE ACERCA DE AVANCE DE OBRAS CIVILES	Ing EDGAR BARRETO (secretaria de infraestructura)	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REPORTADO

Tipo Modalidad	10	M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
Formulario	2000	F71: DATOS BASICOS DE LA OBRA
Moneda Informe	1	
Entidad	9183	
Fecha	2023/10/31	
Periodicidad	1	MENSUAL



[1]	4	7	8
	Entidad Remitente	Tipo de Reporte	Código Único de la Obra
1	FILA_1		N/A

<p align="center">FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)</p>			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 55 de 67



*Indicador de producción de
Obras Civiles - IPOC*

Formulario

Bienvenido al sistema de seguimiento del Indicador de Producción de Obras Civiles - IPOC y del Directorio Nacional de Infraestructura DNI.

SELECCIONE LA CIUDAD: TOCANCIPÁ - CUNDINAMARCA

Cerrar Sesión


Detos Básicos	Listado proyecto	Aprobar proyecto	Asignar proyecto	Listado proyecto asignado	Modificar contraseña
Contactos	Documentos de apoyo				

Registros

10. GESTIÓN DOCUMENTAL

La secretaría en lo correspondiente a la vigencia 2020, realizó la correspondiente transferencia documental al archivo central, como se evidencia en la siguiente imagen :

Así mismo, adjunto los Formularios Únicos de Inventario Documental, del archivo de gestión de la secretaria, cabe resaltar que la información a entregar cumple con los criterios de archivo y se encuentra en custodia del funcionario de carrera administrativa Alexandra Triviño.

	<p>CERTIFICACIÓN DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL</p>	<p>CODIGO: SIC-FSCB VERSIÓN: 005 FECHA: OCTUBRE 2020</p>
---	---	--

El suscrito Profesional Universitario de la Secretaría Administrativa encargado del Archivo Central de la administración Municipal,

CERTIFICA:

que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, tiene al día las transferencias documentales primarias correspondiente al año 2020, de acuerdo con lo estipulado en las Tablas de Retención Documental.

Se expide a los 22 del mes de junio del año 2023.


 Profesional Universitario

Proceso Gestión de la Información y el Conocimiento
ARCHIVO CENTRAL

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 56 de 67

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL											
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		SECRETARÍA DE SALUD		SECRETARÍA DE CULTURA	
No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE ARCHIVO	FECHA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE DESTRUCCIÓN	FECHA DE RECONSTRUCCIÓN	FECHA DE REVISIÓN
1	GI-PR-001	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	06/nov./2020								
2	GI-P-002	PROCEDIMIENTO ALQUILER DE MAQUINARIA	25/ene./2023								
3	GI-P-001	PROCEDIMIENTO OBRAS MENORES CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	26/abr./2021								
4	GI-P-005	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	31/ago./2022								
5	GI-I-002	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	03/ago./2021								
6	GI-F-002	ACTA DE COMITÉ	28/nov./2014								
7	GI-F-003	ORDEN ALQUILER DE MAQUINARIA	28/nov./2014								
8	GI-F-005	SOLICITUD ALQUILER DE MAQUINARIA	28/nov./2014								

En lo pertinente al inventario documental de los años 2021, 2022 y 2023, se encuentra debidamente organizado y no se ha remitido al archivo central, por cuanto no se han establecido las fechas y/o cronogramas para tal efecto.

11. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

a. Documentos del proceso

El proceso de Gestión de Infraestructura se encuentra integrado al sistema de gestión de calidad de la alcaldía municipal que se gestiona a través de la plataforma Isolución y en la cual se tiene la siguiente documentación:

CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:			
GI-PR-001	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Vrs 9	06/nov./2020
PROCEDIMIENTOS			
GI-P-002	PROCEDIMIENTO ALQUILER DE MAQUINARIA	Vrs 5	25/ene./2023
GI-P-001	PROCEDIMIENTO OBRAS MENORES CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	Vrs 5	26/abr./2021
GI-P-005	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Vrs 1	31/ago./2022
INSTRUCTIVOS			
GI-I-002	INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	Vrs 1	03/ago./2021
FORMATOS			
GI-F-002	ACTA DE COMITÉ	Vrs 2	28/nov./2014
GI-F-003	ORDEN ALQUILER DE MAQUINARIA	Vrs 4	28/nov./2014
GI-F-005	SOLICITUD ALQUILER DE MAQUINARIA	Vrs 2	28/nov./2014

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 57 de 67

CODIGO	NOMBRE DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA
GI-F-007	PLANILLA DE SOLICITUDES, TRAMITE Y EJECUCION DE OBRAS MENORES CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	Vrs 2	28/nov./2014
GI-F-008	REGISTRO HORARIO MAQUINARIA	Vrs 2	28/nov./2014
GI-F-010	ORDEN DE TRABAJO	Vrs 2	21/abr./2021
GI-F-011	GI-F011_SOLICITUD OBRA MENOR	Vrs 1	21/abr./2021
GI-F-012	INFORME DE VISITA	Vrs 1	21/abr./2021
GI-F-013	SOLICITUD DE APOYO TECNICO PARA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS	Vrs 1	30/abr./2021
GI-F-014	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A CONTRATOS	Vrs 2	16/nov./2023
GI-F-015	INFORME SEGUIMIENTO A PROYECTOS	Vrs 1	14/may./2021
GI-F-016	INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA EN GARANTIA	Vrs 1	29/jun./2022
GI-F-017	SEGUIMIENTO A PERSONAL DE OBRA	Vrs 1	16/dic./2022
GI-F-018	CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL	Vrs 2	25/abr./2023
GI-F-019	INFORME SEMANAL DE AVANCE	Vrs 3	11/jul./2023
GI-F-020	CONTROL DEL CLIMA	Vrs 1	25/abr./2023
GI-F-021	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Vrs 1	25/abr./2023
GI-F-022	MEMORIA DE CANTIDADES	Vrs 1	24/abr./2023
GI-F-023	MEMORIA GRAFICA	Vrs 1	25/abr./2023
GI-F-024	GI-F024 INFORME DE IMPREVISTOS	Vrs 1	25/abr./2023
GI-F-025	GI-F-025_ACTA RECIBO PARCIAL INTERVENTORIA	Vrs 1	26/oct./2023
GI-F-026	GI-F-026_CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYO	Vrs 1	27/oct./2023
GI-F-027	GI-F-027_CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Vrs 1	27/oct./2023

A través de la plataforma Isolución se puede consultar la documentación anteriormente relacionada, así como el normograma actualizado para el proceso, los indicadores formulados para el seguimiento, la matriz de riesgo y los planes de mejora que resultan de los hallazgos realizados por la auditorías internas y externas.

b. Indicadores de seguimiento del proceso

El proceso cuenta con trece (13) indicadores, los cuales se corresponden con los establecidos en el plan de desarrollo:

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)








CÓDIGO: GES-F-054 VERSIÓN: 001 FECHA: SEPTIEMBRE 2023 Pág. 58 de 67

ID	Nombre	Unidad de Medida	Fuente Información	Meta del cuatrienio	Tipo de indicador
270	Mantenimiento de Luminarias	Porcentaje	Informes de Ejecución de avance de obra u Ordenes de Trabajo	3610	Resultado
352	Vías Terciarias Mantenidas_V2	Kilómetros	Informes de Ejecución de avance de obra	160	Resultado
371	Construcción de Infraestructura Educativa_v2	Unidades	informes de avance de obra	2	Resultado
372	Construcción de Infraestructura Cultural_v2	Unidades	Informes de avance de obras	1	Resultado
387	Construcción de Infraestructura Deportiva_3	Unidades	Informes avance de obra	2	Resultado
397	Construcción de Infraestructura Institucional_V2	Unidades	Informes de ejecución de avances de obra	3	Resultado
398	Mantenimiento de Infraestructura Deportiva_V2	Unidades	Informes de Ejecución de avance de obra u Ordenes de Trabajo	64	Resultado
399	Mantenimientos de Infraestructura Cultural_V2	Unidades	Informes de Ejecución de avance de obra u Ordenes de Trabajo	6	Resultado
400	Mantenimientos de Infraestructura Educativa_V2	Unidades	Informes de Ejecución de avance de obra u Ordenes de Trabajo	12	Resultado
401	Mantenimientos de Infraestructura Institucional_V2	Unidades	Informes de Ejecución de avance de obra u Ordenes de Trabajo	35	Resultado
402	Mantenimiento de Zonas Verdes_V2	Unidades	Informes de Mantenimiento Ordenes de Trabajo	20	Resultado
403	Vías Terciarias Construidas_V2	Kilómetros	Informes de Ejecución de avance de obra	5	Resultado
404	Vías Urbanas Mantenidas_V2	Kilómetros	Informes de Mantenimiento	10	Resultado

i. Seguimiento de indicadores (plataforma Isolución)

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 59 de 67

De acuerdo con el seguimiento a los indicadores del proceso, se tiene un porcentaje de cumplimiento promedio equivalente al 252.90807%, a partir de la relación de cumplimiento para cada indicador:

Indicador	Valor Real Acumulado	Meta	Valor real	Fecha medición	% Cumplimiento	Gráfica
<u>Construcción de Infraestructura Cultural v2</u>	0,68	0,12	0,25	31/jul./2023	208.33333 %	
<u>Construcción de Infraestructura Deportiva 3</u>	5,01442	0,75	0,8	30/jun./2023	106.66667 %	
<u>Construcción de Infraestructura Educativa v2</u>	0,57529	0,25	0,15	31/jul./2023	60 %	
<u>Construcción de Infraestructura Institucional V2</u>	1,91729	0,5	0,4	30/jun./2023	80 %	
<u>Mantenimiento de Infraestructura Deportiva V2</u>	63	8	28	30/jun./2022	350 %	
<u>Mantenimiento de Luminarias</u>		25	119,11	30/dic./2022	476.44 %	
<u>Mantenimiento de Zonas Verdes V2</u>	33	2,5	2	30/jun./2023	80 %	
<u>Mantenimientos de Infraestructura Cultural V2</u>	23	0,75	3	30/jun./2023	400 %	
<u>Mantenimientos de Infraestructura Educativa V2</u>	50	1,5	11	30/jun./2023	733.33333 %	
<u>Mantenimientos de Infraestructura Institucional V2</u>	103	5,25	25	30/jun./2023	476.19048 %	
<u>Obras Menores - Cliente Interno y Externo</u>		70	75,27	31/dic./2022	107.52857 %	
<u>Vías Terciarias Construidas V2</u>	18,191	0,63	0,85	31/dic./2022	134.92063 %	
<u>Vías Terciarias Mantenidas V2</u>	111,9	20	13,3	31/ene./2023	66.5 %	
<u>Vías Urbanas Mantenidas V2</u>	33,03	1,25	3,26	31/dic./2022	260.8 %	

Fuente: Isolución® 5 (isolucion.co) <https://alcaldiatocancipa.isolucion.co/Medicion/ConsultaIndicadores.aspx>

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 60 de 67

c. Riesgos operativos y riesgo de corrupción del proceso:

i. Riesgo identificados en la Ejecución y administración de procesos :

GI-14 Posibilidad de pérdida de vidas humanas y/o afectaciones en la salud del personal de la entidad y/o de los contratistas, por descuido del personal o falta de supervisión en la ejecución de las actividades laborales, que se suceden por deficiencia en las capacitaciones, falta de recursos para ejecutar adecuadamente las actividades y/o deficiencia en el control.

Causa inmediata	Causa raíz
<ul style="list-style-type: none"> - Descuidos durante la ejecución de las actividades - Falta de supervisión de las actividades que impliquen riesgo 	<ul style="list-style-type: none"> - Deficiencia o falta de capacitaciones - Falta de eficiencia en el control durante, pre y post la ejecución de las actividades - Falta de recursos para ejecutar adecuadamente las actividades.

G-15 Posibilidad de que la supervisión reciba infraestructura construida deficientemente, la cual no se pueda poner al servicio y/o que genera altos costos de mantenimiento; causados por el mal ejercicio de la interventoría y/o contratistas con poca capacidad técnica y/o faltos de ética.

Causa inmediata	Causa raíz
<ul style="list-style-type: none"> - Mal ejercicio de la Interventoría o Auditorias, por capacidad técnica o falta de ética. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mal ejercicio de la Interventoría o Auditorias, por capacidad técnica o falta de ética

ii. Riesgos de corrupción :

Los riesgos de corrupción identificados por el equipo de profesionales del proceso de Gestión Infraestructura son los siguientes:

GI-12 Posibilidad de recibir obras que no cumplen con los diseños y/o especificaciones contratadas, causado por la alteración de información por parte del funcionario para beneficio propio o de terceros, por falta de ética profesional y compromiso con la entidad

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 61 de 67

Causas	Consecuencias
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de ética y compromiso del funcionario con la Entidad., - Debilidad en el control a la aplicación de la normativa vigente por parte de los servidores responsables 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales., - Perdida de credibilidad y confianza institucional., Daño patrimonial

GI-13 Posibilidad de pérdida de recursos públicos durante la aprobación de presupuestos de obra y/o ítems no previstos que surgen en el desarrollo de los contratos de obra y que son aprobados por las interventorías por deficiencia en su elaboración y revisión

Causas	Consecuencias
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de guías e instructivos para la ejecución de la actividad, - Falta de ética y compromiso del funcionario con la Entidad., - Mal ejercicio de la Interventoría o Auditorías, por capacidad técnica o falta de ética 	<ul style="list-style-type: none"> - Sanciones disciplinarias, pecuniarias y penales., - Perdida de credibilidad y confianza institucional., - Daño patrimonial

d. Informe de hallazgos, no conformidades, acciones de mejora

En la plataforma Isolución, en la pestaña correspondiente a la mejora, se tienen reportadas las siguientes acciones que deben avanzar para el proceso de cierre:

i. Acciones preventivas:

A desarrollar en el corto plazo, para evitar que se conviertan en hallazgos de no conformidad. A la fecha se tiene un avance ponderado del 70% en la formulación de los formatos propuestos.

No	Estado	Descripción
<u>1</u>	Abierta	Acción creada desde valoración del riesgo DAFT. Se debe crear la Lista de Chequeo para verificar el cumplimiento normativo en la ejecución de documentos complementarios para el proceso precontractual.
<u>2</u>	Abierta	Acción creada desde valoración del riesgo DAFT. Se debe crear el instructivo o manual para verificar el un adecuado proceso de ejecución de los presupuestos, así como de los ítems no previstos presentados por los contratistas

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 62 de 67

ii. **Oportunidades de mejora**

Resultado de observaciones realizadas en la auditoría interna realizada en el año 2022 y que se encuentran en proceso de conciliación con el administrador del sistema de calidad para promover el cierre.

No	Estado	Descripción
205	Abierta	Conforme a la verificación realizada en el proceso de auditorías internas, que evidencio que en las instalaciones donde operan los procesos Asesoría Jurídica y Gestión Cultural y Patrimonial, se requiere intervención de manera prioritaria, con el fin de salvaguardar los recursos que poseen (humanos, técnicos, documentales, entre otros), Así mismo, el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, evaluar la posibilidad de reubicación de instalaciones de operación de los funcionarios.
206	Abierta	Continuar con el seguimiento y monitoreo a los productos y entregables del Plan de Acción, que le permita a la dependencia tomar acciones planificadas para el cumplimiento de los requisitos o características de sus productos y especialmente de los términos o tiempos de ejecución de los diferentes proyectos que afectan el reporte de indicadores y la ejecución presupuestal del proceso.

iii. **Auditoría externa – Contraloría Departamental**

Se presentan las acciones de mejora propuestas y aprobadas por la Contraloría Departamental en el Plan de Mejoramiento, Auditoría Financiera y de Gestión vigencia fiscal 2022, PVCFT – 2023., y que están a cargo del proceso:

Nº hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora
12	<p>EVALUACIÓN GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO</p> <p>CONDICIÓN: En el plan de desarrollo del Municipio de Tocancipá "TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI" en su plan operativo anual de inversiones se identificaron los siguientes programas con bajo porcentaje en ejecución, respecto a resultados en eficacia por cumplimiento de las metas.</p> <p>Criterio: Plan de desarrollo del municipio.</p>	<p>Reformular los proyectos de ciclo infraestructura y mantenimiento de puentes peatonales a partir de un diagnóstico actualizado.</p> <p>META</p> <p>Proyectos formulados / Total Proyectos a Formular X 100</p>

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 63 de 67

	<p>Causa: Debilidades en la gestión para lograr el fortalecimiento y priorización de las metas de programas relevantes para el desarrollo y beneficio de la comunidad municipal.</p> <p>Efecto: Falta de beneficio a la población y retraso en el desarrollo de planes que representen mejores condiciones para el municipio.</p> <p>Ver Página 66</p>	<p>FECHA DE FORMULACIÓN DE LA ACCIÓN</p> <p>30/06/2024</p>
13	<p>CONTRATACIÓN</p> <p>SUPERVISIÓN:</p> <p>CONDICIÓN 1: Teniendo en cuenta la situación presentada con el contrato 440, en lo que tiene que ver con la no observancia de las garantías y sus respectivas aprobaciones en la carpeta contractual, el equipo auditor observa que incumple el manual de supervisión e Interventoría, documento controlado identificado con la nomenclatura GC-M-002, versión 002, de octubre de 2021, capítulo octavo, numeral 8.2. Funciones Administrativas: La supervisión o interventoría se ejerce de manera integral y conlleva al control del contrato desde el inicio de su ejecución hasta su terminación y liquidación o hasta el cierre del expediente contractual (cuando este último aplique). Numeral 5. Velar por la actualización oportuna de la vigencia de los amparos de la garantía única constituida con una duración igual al plazo de ejecución y hasta la liquidación del contrato o convenio, como mínimo, en los términos Página 16 de 23 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CÓDIGO: GC-M-002 VERSIÓN: 002 FECHA: OCTUBRE 2021 pactados para cada uno de ellos y allegar las mismas de manera oportuna a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación. 6. Numeral 6. Elaborar el informe una vez vencidas las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o se cumplan las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.</p>	<p>Definir, formular e implementar herramienta de control (lista de chequeo) que permita garantizar el cumplimiento de todas las actividades de seguimiento que debe atender el interventor y el supervisor del contrato</p> <p>META</p> <p>Lista de chequeo formulada e implementada</p> <p>FECHA DE FORMULACIÓN DE LA ACCIÓN</p> <p>18/10/2024</p>

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 64 de 67
--------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

iv. Recurso Humano de apoyo al Sistema de Gestión de Calidad

Gestor de Mejora	Hernando Vallejo Obando – PE
Delegado del gobierno digital:	
Encargado de publicación de información en la sede electrónica	

12. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG

La Secretaría de Infraestructura no tiene responsabilidad directa en la formulación de políticas concebidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, pero está atenta para promover e implementar todos los lineamientos que se determinen para asegurar la alineación con los objetivos de la entidad.

13. APLICATIVOS Y CONTRASEÑAS

Los siguientes son los aplicativos que se utilizan al interior de la secretaria para efecto del reporte de información, las contraseñas se asignan directamente al funcionario a cargo y será determinado oportunamente por el área de sistemas de la administración.

APLICATIVO	ENTIDAD	PROFESIONAL RESPONSABLE	OBSERVACIONES
SISMAN WEB	Alcaldia de Tocancipa	Director Tecnico	
PLATAFORMA CODIGO LAMAC	Departamento Nacional de Estadística	Director Tecnico	
SPI	Departamento Nacional de Planeación	Director Tecnico	
SUIF TERRITORIO	Ministerio de Cultura	Director Tecnico	
SECOP Iy II	Agencia nacional de contratación publica - Colombia Compra Eficiente	Director Tecnico	
TIENDA VIRTUAL TVEC	Agencia nacional de contratación publica - Colombia Compra Eficiente	Secretario de infraestructura	

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 65 de 67

RECOMENDACIONES

Las siguientes son las recomendaciones que debe conocer la nueva administración referente al mejor funcionamiento de la Secretaría:

- Dar continuidad a las obras actualmente en ejecución y contratadas y que por diversos motivos presentan atraso en su finalización, permitiendo de esta manera ser puestas al servicio de la comunidad
- Fortalecer el personal operativo y administrativo adscrito a esta secretaria acorde al crecimiento del municipio a fin de ser consecuente con el estudio de cargas laborales, lo cual optimizara los recursos y celeridad en los procesos
- Renovar la maquinaria amarilla con el objeto de contar con la misma en óptimas condiciones durante la mayoría del año y de esta manera atender prontamente los requerimientos y la programación de obras de mantenimiento
- Mejorar las condiciones de espacio en el área administrativa para contar con las condiciones adecuadas de mobiliario y equipos mejorando el bienestar y rendimiento de los servidores públicos.
- Adquisición de software, equipos de sistemas y capacitaciones acordes a las necesidades y requerimientos de los contratos previamente solicitado a la oficina de sistemas (TIC)

FORMATO ÚNICO ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023 (Ley 951 de marzo 31 de 2005)			
CÓDIGO: GES-F-054	VERSIÓN: 001	FECHA: SEPTIEMBRE 2023	Pág. 66 de 67

14. SUSCRIPCIÓN ACTA PARCIAL DE INFORME DE GESTIÓN:

Los abajo firmantes acuerdan lo siguiente:

- Entregan y reciben la información anterior para su estudio.
- Agregar al acta final de forma más detallada los inconvenientes que se han presentado en cada proyecto y las recomendaciones pertinentes por parte de la secretaria de infraestructura.
- Se acuerda realizar un recorrido de visitas de obras el próximo lunes once (11) de diciembre desde las ocho AM, en presencia del Sr alcalde electo

QUIEN ENTREGA

FIRMA

NOMBRE: Ing MARIO E SUANCA PULIDO

CARGO: secretario de Infraestructura.

CEDULA: 80398416 CUII.

CORREO ELECTRONICO: mario.suanca@tocancipa.gov.co

FIRMA

NOMBRE: Ing HUGO C ESPINOSA S.

CARGO: director técnico - secretaria de Infraestructura

CEDULA: 4238905 (STCO)

CORREO ELECTRONICO:

FUNCIONARIO QUE APOYA LA ENTREGA

FIRMA

NOMBRE: Ing MAURICIO RODRIGUEZ

CARGO: Profesional especializado secretaria de infraestructura

DELEGADOS DEL MANDATARIO ELECTO QUE RECIBE

FIRMA

NOMBRE: Ing RAFAEL ANTONIO RIVERA G.

DELEGADO MANDATARIO ELECTO

CEDULA: 11344235

CORREO ELECTRONICO: rafago2@gmail.com

FORMATO ÚNICO
ACTA PARCIAL No. 01 DE INFORME DE GESTIÓN
TRANSICIÓN DE GOBIERNO ALCALDIA MUNICIPAL
TOCANCIPÁ TRABAJAMOS PARA TI 2020-2023
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)


CÓDIGO: GES-F-054

VERSIÓN: 001

FECHA: SEPTIEMBRE 2023

Pág. 67 de 67

FIRMA



NOMBRE: VANEZA FORERO AREVALO

DELEGADO MANDATARIO ELECTO

CEDULA: 1020778517


CORREO ELECTRONICO: vaneza.fa@gmail.com

OTRAS FIRMAS

En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, les compete a las oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, velar por el cumplimiento de lo dispuesto en materia de la entrega del acta de informe de gestión

OFICINA DE CONTROL INTERNO

FIRMA



NOMBRE: SANDRA MILENA RUIZ MONCADA

CARGO: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

CORREO ELECTRONICO:

Se anexan diez y siete (17) folios

RELACIÓN DE CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2020

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ESTADO DE LOS CONTRATOS
192 MT 2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE TOCANCIPÁ NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN VIGENTES	\$ 1,751,734,824	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO TELMO ALEXANDER CASTILLO FJARDO	\$1,751,734,824	TERMINADO Y LIQUIDADO
193 MT 2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE TOCANCIPÁ NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN VIGENTES	\$ 142,800,000	UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL TOCANCIPÁ 2020 CARLOS ALBERTO BRAVO RIVERA	\$142,800,000	TERMINADO Y LIQUIDADO
238 MT 2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	\$ 7,600,000	RAMIRO GARZON AGUDO	\$7,600,000	TERMINADO SATISFACTORIAMENTE
321 MT 2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SECRETARIA DE AMBIENTE	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	\$ 424,144,045	FERRETERIA FORERO S.A.	\$424,144,045	TERMINADO Y LIQUIDADO

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ESTADO DEL CONTRATO
CVO007-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REPOSICION, Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR LOS PATOS, Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP	1,276,344,567.00	TERMINADO SIN LIQUIDACION

RELACIÓN DE CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2021

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	REQUIERE LIQUIDACION DEL CONTRATO
024 MT 2021	Secretaria de infraestructura	0	RAMIRO GARZON AGUDO	\$32,450,000	NO
357 MT 2021	secretaria administrativa secretaria de gobierno secretaria de infraestructura secretaria de desarrollo economico	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y VEHICULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA	UNION TEMPORAL SERVICIO MANTENIMIENTO SABANA	\$884,554,149	SI
445 MT 2021	Secretaria de infraestructura	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL NO ASFALTADA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO CONSUMINISTRO	\$250,000,000	SI
449 MT 2021	Secretaria de infraestructura	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA	\$18,000,000	NO
459 MT 2021	Secretaria de infraestructura	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CENTROS DE PRIMERA INFANCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS	\$268,263,476	SI
460 MT 2021	Secretaria de infraestructura	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA	\$346,988,789	SI
461 MT 2021	Secretaria de gobierno Secretaria de infraestructura	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION (MUROS DE CONTENCIÓN) PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO OBRAS INGESA OZ	\$383,517,107	SI
463 MT 2021	Secretaria de infraestructura	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS INGESALDI	\$310,190,168	SI

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	CLASE DE CONTRATO	SECTOR AL QUE CORRESPONDE EL GASTO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA
005CTOINT-2021	Secretaria de infraestructura	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	INFRAESTRUCTURA	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	60,000,000.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA. ESP

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	ESTADO DE LOS CONTRATOS
Orden de compra 75343	Secretaria Administrativa Secretaria de infraestructura Secretaria de gobierno Secretaria de desarrollo economico	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO YO LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUSTODIA, ASI COMO AQUELLOS QUE LE PRESTAN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	GRUPO EDS AUTOGAS SAS R.L. JUAN CAMILO GOMEZ JIMENEZ	355.000.000	EN EJECUCIÓN

RELACIÓN DE CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2022

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
010 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	69,300,000	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA	
031 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DE APOYO A LA GESTIÓN Y ARTÍSTICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	34,072,500	RAMIRO GARZON A	
427 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	1,318,109,642	FERRETERIA FORERO S.A	en el modificadorio 2 cambia la fuente de financiación del cdp 2022000642 y se expide el cdp 202200171
437 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO MILENIO, SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	14,930,608,712	CONSORCIO ACRÓPOLIS	
440 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	484,449,894	CONSORCIO TOCANCIPÁ IT	N/A
441 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN EL CORREDOR VIA PARAMO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 01290 DE 2021 SUSCRITO CON EL INVIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	557,212,089	CONSORCIO TERRA-IN	
448 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	16,376,116,616	CONSORCIO BS INGENIERIA	VF 2023 ACUERDO MPAL #01 DEL 2022 VIGENCIA ACTUAL 10102235983 VIGENCIA 2023 6273880633
450 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	544,512,005	OMAIRA RIAÑO MOLANO	NA

452 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	3,228,657,397	CONSORCIO MANTOSAR	NA
458 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	18,518,517,963	CONSORCIO LOS PATOS	NA
459 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	29,797,600	INGELCO PROYECTOS E.U.	NA
460 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	1,481,481,471	CONSORCIO CANARDS	NA

461 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	1,497,378,804	CONSORCIO COMUNAL SAN JUAN	NA
462 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO MILENIO, SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	1,194,449,481	CONSORCIO LA INTERVENTORIA	NA
477 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION Y EDUCACION INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	1,316,604,045	CONSORCIO STARK	NA
478 MT 2022	SECRETARIA ADMINISTRATIVA- INFRAESTRUCTURA-GOBIERNO- DESARROLLO ECONOMICO	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD YO A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y VEHICULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO INCLUYE MANO DE OBRA	630,732,026	UNION TEMPORAL SERVICIO MANTENIMIENTO SABANA	NA
486 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	11,999,999,997	UNION TEMPORAL CECULTO	TIENE RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS
487 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	119,825,297	GUILLERMO CAICEDO NIETO	TIENE RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS

508 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	959,867,739	UNION TEMPORAL CULTURAL 2022	NA
519 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	258,292,828	CONSORCIO INTER COLISEO	NA
537 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	54,451,201	CONSORCIO LAS PALMAS	NA

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
OC-93786	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL NO ASFALTADA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	250,000,000	ARINTIA GROUP SAS	NA
OC-102191	SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO YO LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUSTODIA, ASI COMO AQUELLOS QUE LE PRESTAN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	420,000,000	GRUPO EDS AUTOGAS S. A. S.	NA

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO DE LOS CONTRATOS
CTO ESPECIFICO No.2210741 CTO DE MANDATO No. 221009	INFRAESTRUCTURA	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	20.000.000.000	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio	EN EJECUCION

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO
CVOINT 003 MT 2022	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	A UNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	133,000,000	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.	EN EJECUCION

RELACIÓN DE CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AÑO 2023

020 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	52,920,000	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA	68,355,000	EN EJECUCION
050 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DE APOYO A LA GESTIÓN Y ARTÍSTICOS	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	32,523,750	RAMIRO GARZON AGUDO	32,523,750	EN EJECUCION
185 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato de Obra	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	445,969,040	CONSORCIO EDUCATIVO	522,000,000	EN EJECUCION
186 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato de Obra	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTROS DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.	322,200,915	CC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	483,200,915	EN EJECUCION
327 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato de Obra	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	340,243,474	CONSORCIO EC TOCANCIPA 2022	510,365,211	EN EJECUCION
416 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Contrato de Consultoría	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA VEREDA VERGANZO, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	331,883,746	UNION TEMPORAL CDP TOCANCIPA	331,883,746	SUSPENDIDO

514 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO MILENIUM DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	3,315,270,852	UNIÓN TEMPORAL PYP TOCANCIPA	3,315,270,852	EN EJECUCION
515 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO MILENIUM DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	278,356,406	CONSORCIO INTER MILENIUM 2023	278,356,406	EN EJECUCION
518 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBRA PÚBLICA	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.	5.820.874.247	GS VIAS Y ESTRUCTURAS	5.820.874.247	CELEBRADO
521 MT 2023	SECRETARIA ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE ECONOMICO SECRETARIA DE AMBIENTE	SUMINISTROS	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y VEHICULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA).	910,664,091	ALTERNAMOTOR S.A.S	910,664,091	EN EJECUCION
544 MT 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	500,337,880	CONSORCIO INTARSEG PUENTE	500,337,880	CELEBRADO

NUMERO DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	CLASE DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CONTRATISTA	OBSERVACIONES
ICCU-CTO-1194 DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE, SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA	250,000,000	INTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	
ICCU-CTO-1193 DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO, SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	250,000,000	INTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	

OBJETO DE LA OBRA	NOMBRE RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	NOMBRE RAZON SOCIAL DE INTERVENTORÍA	ESTADO		OBSERVACIONES
			EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	
AÑOS 2018 Y 2019					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO RECREO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		CONSORCIO TAYRONA NIT: 901178298	XX		
ADECUACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMENTO RECREO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO INDUGU NIT 901.176.603-5		XX		
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPÁ		CONSORCIO PROHOSPITALARIO 2020	XX		
TERMINACION CONSTRUCCION NUEVA SEDE DEL HOSPITAL DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 2018		XX		
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CUNDINAMARCA	UNION TEMPORAL CRIR 2018		XX		
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	XX		
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES S.A			XX	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ		CONSORCIO AUDITORIO 2019		XX	
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALAMEDA CARRERA 4 DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. TRAMO: VÍA CARRERA BOGOTÁ-LA CARO-TUNJA, RUTA 5501, SECTOR PASO URBANO POR TOCANCIPÁ, ENTRE EL PR 21+1118 Y PR 25+0964	CONSORCIO CARRERA CUARTA		XX		ETAPA DE LIQUIDACIÓN
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA ALAMEDA CARRERA 4		UNION TEMPORAL ALAMEDAS		XX	ETAPA DE LIQUIDACIÓN
CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLEGIO SECTOR TOLIMA MILENIO VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO MILENIO NIT 901.350.234			XX	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO MEGA II			XX	
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLEGIO SECTOR TOLIMA MILENIO VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.		CONSORCIO INTERVENTORIA ER		XX	
ADECUACION, MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ESCENARIO MULTIPLE DEPORTIVO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO ESTADIO 2020			XX	

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA LOGISTICA DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA		CONSORCIO INTERVENTORIA 2021		XX	
INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AY AMBIENTAL PARA ADECUACION, MEJORAMIENTO YO CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ESCENARIO MULTIPLE DEPORTIVO DE TOCANCIPA		CONSORCIO DEPORTIVO EG		XX	
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE APOYO PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE CUNDINAMARCA, EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO CAI 2020			XX	
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREODEPORTIVO MILLENIUM, VEREDA VERGANZO, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	CONSORCIO MILLENIUM NIT 901,356,745-5				ETAPA DE LIQUIDACIÓN
INTERVENTORIA TÉCNICA ... MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREODEPORTIVO MILLENIUM, VEREDA VERGANZO, MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		CONSORCIO MILENIUM NIT 901,352,590-3			ETAPA DE LIQUIDACIÓN
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TOCANCIPA	CONSORCIO INTERCON 2020	CONSORCIO INTERCON 2021		XX	
AÑO 2020					
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE TOCANCIPÁ NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN VIGENTES	CONSORCIO NUESTRA SEÑORA DEL TRANSITO TELMO ALEXANDER CASTILLO FJARDO		XX		LIQUIDADO
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE TOCANCIPÁ NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN VIGENTES		UNIÓN TEMPORAL HOSPITAL TOCANCIPÁ 2020 CARLOS ALBERTO BRAVO RIVERA	XX		LIQUIDADO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	RAMIRO GARZON AGUDO		XX		LIQUIDADO
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	FERRETERIA FORERO S.A.		XX		LIQUIDADO
SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL PARA POBLACIÓN VULNERABLE, O EN ESTADO DE NECESIDAD O EN SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ EN EL MARCO DE LAS ACCIONES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID - 19	COMERCIALIZADORA AGROSOCIAL SAS		XX		LIQUIDADO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REPOSICION, Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR LOS PATOS, Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. ESP		XX		TERMINADO

AÑO 2021					
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	RAMIRO GARZON AGUDO		XX		LIQUIDADO
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y VEHICULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA	UNION TEMPORAL SERVICIO MANTENIMIENTO SABANA				ETAPA DE LIQUIDACION
SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL NO ASFALTADA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO CONSUMINISTRO				ETAPA DE LIQUIDACION
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA		XX		LIQUIDADO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CENTROS DE PRIMERA INFANCIA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS		XX		LIQUIDADO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MUNICIPIO	LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA		XX		LIQUIDADO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION (MUROS DE CONTENCIÓN) PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO OBRAS INGESAQZ		XX		LIQUIDADO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS INGESALDI		XX		LIQUIDADO
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO YO LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUSTODIA, ASI COMO AQUELLOS QUE LE PRESTAN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	GRUPO EDS AUTOGAS SAS R.L. JUAN CAMILO GOMEZ JIMENEZ		XX		TERMINADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA. ESP		XX		TERMINADO
AÑO 2022					
1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA		XX		LIQUIDADO
2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	RAMIRO GARZON A		XX		LIQUIDADO
3 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	FERRETERIA FORERO S.A		XX		TERMINADO
4 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO MILENIO, SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO ACROPOLIS			XX	EN EJECUCION
5 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO TOCANCIPA IT			XX	

6	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN EL CORREDOR VIA PARAMO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO 01290 DE 2021 SUSCRITO CON EL INVIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	CONSORCIO TERRA-IN		XX		LIQUIDADO
7	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO BS INGENIERIA			XX	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.	OMAIRA RIAÑO MOLANO			XX	EN EJECUCION
9	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO MANTOSAR			XX	EN EJECUCION
10	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.	CONSORCIO LOS PATOS			XX	EN EJECUCION
11	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.	INGELCO PROYECTOS E.U.			XX	
12	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO CANARDS			XX	EN EJECUCION
13	CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO COMUNAL SAN JUAN			XX	ETAPA DE LIQUIDACION
14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO MILENIO, SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO LA INTERVENTORIA			XX	EN EJECUCION
15	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION Y EDUCACION INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO STARK			XX	EN EJECUCION
16	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD YO A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y VEHICULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO INCLUYE MANO DE OBRA	UNION TEMPORAL SERVICIO MANTENIMIENTO SABANA		XX		TERMINADO
17	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.	UNION TEMPORAL CECULTO			XX	EN EJECUCION
18	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	GUILLERMO CAICEDO NIETO			XX	EN EJECUCION
19	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	UNION TEMPORAL CULTURAL 2023			XX	EN EJECUCION
20	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	CONSORCIO INTER COLISEO			XX	EN EJECUCION
21	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.	CONSORCIO LAS PALMAS			XX	EN EJECUCION
	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL NO ASFALTADA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	ARINTIA GROUP SAS			XX	EN EJECUCION
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES Y MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO YO LOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU RESPONSABILIDAD O CUSTODIA, ASI COMO AQUELLOS QUE LE PRESTAN SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	GRUPO EDS AUTOGAS S. A. S.			XX	EN EJECUCION

	MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREODEPORTIVO LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio			XX	EN EJECUCION
	AUNAR ESFUERZOS PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIAS, ESPACIOS PUBLICOS Y ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P.			XX	EN EJECUCION
	AÑO 2023					
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO EN LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA			XX	ETAPA FR LIQUIDACION
2	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA OPERACION DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	RAMIRO GARZON AGUDO			XX	ETAPA FR LIQUIDACION
3	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO EDUCATIVO		XX		EN ETAPA DE LIQUIDACION
4	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTROS DE ATENCION DE LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CC CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS				LIQUIDADO
5	REALIZAR EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	CONSORCIO EC TOCANCIPA 2022			XX	EN ETAPA DE LIQUIDACION
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN LA VEREDA VERGANZO, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POLIDEPORTIVO TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	UNION TEMPORAL CDP TOCANCIPA			XX	EN EJECUCION
7	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO MILENIUM DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	UNIÓN TEMPORAL PYP TOCANCIPA			XX	EN EJECUCION
8	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE RECREO DEPORTIVO MILENIUM DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA		CONSORCIO INTER MILENIUM 2024		XX	EN EJECUCION
9	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.	GS VIAS Y ESTRUCTURAS			XX	PENDIENTE DE ACTA DE INICIO
10	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA Y VEHICULOS VINCULADOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO (INCLUYE MANO DE OBRA).	ALTERNAMOTOR S.A.S			XX	EN EJECUCION
11	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA		CONSORCIO INTARSEG PUENTE		XX	PENDIENTE DE ACTA DE INICIO
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO URBANO CON LA VEREDA LA FUENTE, SECTOR PUENTE MICOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA	INTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA			XX	PENDIENTE POR INICIAR
	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA CANAVITA CON EL MUNICIPIO DE SOPO, SECTOR BUENOS AIRES PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	INTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA			XX	PENDIENTE POR INICIAR

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA
DESCANSO COMPENSADO REMUNERADO DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

ITEMS	NOMBRES Y APELLIDOS	TURNO UNO: SEMANA DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE 2023	TURNO DOS: SEMANA DEL 2 AL 5 DE ENERO DE 2024	TURNO TRES SEMANA DEL 9 AL 12 DE ENERO DE 2024
1	YENI ALEXANDRA TRIVIÑO OSPINA		X	
2	OSCAR JAVIER PARADA AVELLA		X	
3	SONIA MERCEDES RODRIGUEZ			X
4	JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CORREA		X	
5	LUIS ANTONIO RODRIGUEZ			X
6	HERNANDO VALLEJO OBANDO	X		
7	EDGAR AUGUSTO BARRETO			
8	OSCAR IVAN PRIAS	X		
9	MARIO NOVOA			X
10	RAUL ALBEIRO JIMENEZ ANGEL			X
11	CARLOS FRANCISCO VELASQUEZ		X	
12	FERNANDO MORENO MORALES		X	
13	QUERUBIN SANCHEZ		X	
14	RICARDO GONZALEZ		X	
15	CESAR ROLANDO RAMIREZ		X	
16	ORLANDO SOLER MARTINEZ	X		
17	RODOLFO ROCHA			X
18	MIGUEL ANGEL GALVIS ROA		X	
19	MAURICIO ROZO GÓMEZ	X		
20	JEFERSON RODRIGUEZ	X		

Número de Convenio	Objeto	Fecha perdida de competencia para liquidar	Detalle el número asignado a los contratos derivados del Convenio	ESTADO DEL CONVENIO A NOVIEMBRE DE 2023
CNV 019 MT 2017	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 400 M3 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP LOS PATOS DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	1/07/2021	Contrato de obra 066 de 2018 Contrato de interventoría 068 de 2018	Certificado de cierre del expediente contractual - 30 de noviembre de 2022
CVN 020 MT 2017	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DE LA RED SANITARIA PARA REALIZAR LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE BUENOS AIRES Y VIA PIE DE MONTE CANAVITA HASTA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE TOCANCIPA	7/03/2022	Contrato 041 de 2018 - Obra. Acta de liquidación Contrato 044 de 2018 - Interventoría. Acta de liquidación	Con proyecto de acta de cierre, pendiente balance financiero a presentar por parte de la ESPT - Se debe desglosar la ejecución de los contratos derivados que aportan al cumplimiento del convenio
CNV 018 MT 2017	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS ENTRE EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA S.A. E.S.P. CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LA VIABILIDAD EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, ASI COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN ESCENARIO CIERTO QUE LE PERMITA LA SOSTENIBILIDAD Y AUTOSUFICIENCIA EN EL CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO	11/06/2022	Contrato de consultoría No. 074 de 2018	En proceso de recopilación y aporte de información relacionada con los contratos derivados del convenio suscritos por la ESPT para proyectar acta de cierre del expediente, dada la pérdida de competencia para liquidar. Según lo informado por la ESPT, el contrato de consultoría derivado se encuentra liquidado.
CVN 011 MT 2017	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA VEREDA VERGANZO, SECTOR TOLIMA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA DE TOCANCIPA	27/10/2020	Contrato de obra 081 de 2017 Contrato de interventoría 082 de 2017	Con Certificado de cierre de expediente contractual - 22-02-2023
CNV 007 MT 2017	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR CABO EL MANTENIMIENTO, ESTABILIZACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE VERGANZO Y CANAVITA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS TERCARIOS QUE PERMITAN OBTENER AGUAS TRATADAS CON CARACTERISTICAS DE REUSO- FASE II EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	23/06/2021	Contrato de obra 071 de 2017 Contrato de interventoría 076 de 2017	Sin liquidar. La ESPT tiene abierto un proceso de presunto incumplimiento del contrato derivado No 071 de 2017, el cual, a la fecha, se encuentra en etapa decisoria, según se ha informado por parte de la empresa.
CNV 007 MT 2016	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN PARA LLEVAR CABO EL MANTENIMIENTO, ESTABILIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS TERCARIOS QUE PERMITAN OBTENER AGUAS TRATADAS CON CARACTERISTICAS DE REUSO	28/09/2021	Contrato de obra 071 de 2017 Contrato de interventoría 076 de 2017	Sin liquidar. La ESPT tiene abierto un proceso de presunto incumplimiento del contrato derivado No 071 de 2017, el cual, a la fecha, se encuentra en etapa decisoria, según se ha informado por parte de la empresa.
CNV 006 MT 2016	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5000 M3 PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO AUTONOMO DE LOS PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	30/03/2021	Contrato de obra 074 de 2017 Contrato de interventoría 077 de 2017	Con Certificado de cierre de expediente contractual - 20-02-2023
CNV 301 de 2011	AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CAR Y EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA PARA CONTRIBUIR CON EL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS EMISARIOS FINALES Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		Convenio 014 de 2011 suscrito entre el Municipio y la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipa (Convenio liquidado)	Liquidado

SEGUIMIENTO AL AVANCE EN EL TRAMITE DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Número de Convenio	Objeto	Fecha perdida de competencia para liquidar	Detalle el número asignado a los contratos derivados del Convenio	ESTADO DEL CONVENIO A NOVIEMBRE DE 2023
CNV EPC-PDA-CI-069-2023	AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA CONTRATAR LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LOS PATOS, DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, CUNDINAMARCA"		En proceso de ejecución por parte de ESPT	En ejecución
CNV 008 MT 2021	AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REPOSICION, Y OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y REDES DE ACUEDUCTO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	17/03/2025	Contrato de obra 082 de 2022 Contrato de obra 084 de 2022 Contrato de interventoría 078 de 2022 Proceso de la selección simplificada 006 de 2022	El ingeniero Hugo reporta estado
CNV 007 MT2020	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL OBJETO DE AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, HUMANOS, Y ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REPOSICION, Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PTAR LOS PATOS, Y REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	3/10/2024	Contrato 023 de 2021 Contrato de obra 027 de 2021 Contrato de obra 040 de 2021 Contrato de interventoría 049 de 2021 Contrato de interventoría 058 de 2021 DE LA ESPT	El ingeniero Hugo reporta estado.
CNV 003 MT 2019	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN, COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUE COMUNAL EN EL SECTOR SOLER DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	1/07/2022	Contrato de obra 095 de 2019	Sin liquidar. No se puede dar recibo a satisfacción por parte del municipio hasta tanto no se resuelvan los hallazgos establecidos por la Contraloría de Cundinamarca y de acuerdo con el informe de Auditoría Gubernamental presentado en mayo de 2021. Dichos hallazgos dan cuenta de un pasivo ambiental. La ESPT formuló plan de mejoramiento a los hallazgos realizados por la Contraloría y se está a la espera de recibir la información pertinente para avanzar en el proceso de liquidación del convenio.
CNV 007 MT 2018	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN PARA LLEVAR CABO LA PRIMERA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA DE 60 LPS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TRATAMIENTOS TERCIARIOS QUE PERMITAN OBTENER AGUAS TRATADAS CON CARACTERÍSTICAS DE REUSO A UBICAR EN LA VEREDA TIBITO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	29/12/2024	Contrato de obra 059 de 2019 Contrato de interventoría 069 de 2019	El ingeniero Mauricio reporta estado actual.
CNV 005 MT 2018	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA BUENOS AIRES COLPAPEL	29/11/2021	Contrato 041 de 2018 - Obra. Acta de liquidación. Contrato 044 de 2018 - Interventoría. Acta de liquidación	Con documento de Cierre de Expediente Contractual.



REGISTRO DE ASISTENCIA ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

CODIGO: GES-F026
VERSIÓN: 007
FECHA: NOVIEMBRE 2023

NOMBRE REUNIÓN (COMITÉ):
REUNIÓN DE EMPALME

DEPENDENCIA QUE COORDINA:
INFRAESTRUCTURA

FECHA REUNIÓN: 04 - DIC - 2023
HORA INICIO: 8:00 AM.

TEMA CENTRAL:
ENTREDA INFORMACION

LUGAR:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

HORA FINALIZACIÓN: 12:00 AM

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	CARGO / ACTIVIDAD / OCUPACIÓN	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rafael A. Rivera G	C.C.	11344235	Comisión Empalme		3123503246	raprigo2@gmail.com	
2	Sandra Milena Ruiz M.	C.C.	35479088	Jefe Of. Control Interno	Alcaldía	3212084088	Sandra.ruiz@tocancipa.gov.co	
3	E. Jambuscay	CC	3210223					
4	José Mauricio Rodríguez C	C.C.	79639224	P. Especializado	Alcaldía	3112519498	mauricio.rodriguez@tocancipa.gov.co	
5	Hugo G Espinosa	CC	4238995	DIRECTOR TECNICO	ALCALDIA	3144865261	hugo.espinosa@tocancipa.gov.co	
6	Vanessa Fajardo Arévalo	CC	1070778517	Lid. empalme	Empalme	3017856152	vanessa.faj@gmail.com	
7	MARIO SUANCA	C.C.	80328496	SECRETARIO	ALCALDIA	3112301956	mario.suanca@tocancipa.gov.co	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

«Por medio de la firma registrada, autorizo al municipio de Tocancipá a utilizar mis datos personales para los fines necesarios relacionados con el tema central, motivo de mi asistencia, de conformidad con las disposiciones de la Ley»

FIRMA RESPONSABLE:
